



**ORKUSTOFNUN**

**Rannsóknasvið**

# **SVARTSENGI**

**Vinnsluefirlit**

**júlí 1997 - júlí 1998**

**Verkfræðistofan Vatnaskil sf**

**Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja**

**1998**

**OS-98044**





**ORKUSTOFNUN**  
Grensásvegji 9, 108 Reykjavík

Verknr. 630 221

**Verkfræðistofan Vatnaskil sf**

## **SVARTSENGI**


**Vinnslueftirlit júlí 1997 - júlí 1998**

**Unnið fyrir Hitaveitu Suðurnesja**

**OS-98044**

**Júlí 1998**



<b>Skýrsla nr.:</b> OS-98044	<b>Dags.:</b> Júlí 1998	<b>Dreifing:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Opin <input type="checkbox"/> Lokuð til
<b>Heiti skýrslu / Aðal- og undirtitill:</b> SVARTSENGI Vinnslueftirlit júlí 1997 - júlí 1998	<b>Upplag:</b> 25	
	<b>Fjöldi síðna:</b> 32	
<b>Höfundar:</b> Verkfræðistofan Vatnaskil sf	<b>Verkefnisstjóri:</b> Sverrir Þórhallsson	
<b>Gerð skýrslu / Verkstig:</b> Gagnaskýrsla, árlegt vinnslueftirlit	<b>Verknúmer:</b> 630 221	
<b>Unnið fyrir:</b> Hitaveitu Suðurnesja		
<b>Samvinnuaðilar:</b>		
<b>Útdráttur:</b> Skýrslan fjallar um úrvinnslu gagna um vinnslu og niðurdrátt á jarðhitasvæðinu í Svartsengi og er sú fjórtánda í röðinni um samskonar vinnslueftirlit. Birtar eru niðurstöður fyrir tímabilið júlí 1997 til júlí 1998. Öll gögn eru skráð af starfsmönnum HS með tölvuforriti sem Vatnaskil sf gerðu sérstaklega fyrir hitaveituna. Sýnd er heildarvinnsla fyrir eftirlitstímabilið og yfirlit yfir heildarvinnslu frá upphafi vinnslu í Svartsengi, svo og um gufu- og vatnsstreymi einstakra holna. Vinnsla úr jarðhitasvæðinu árið 1998 (til 1. júlí) var 3,53 millj. tonn en heildarvinnsla frá upphafi nam þá 147,80 millj. tonnum. Meðalvinnslan á árinu nam 227,0 kg/s. Niðurdæling, sem nemur 7,62 milljón tonnum, hefur verið dregin frá tölum um heildarvinnslu. Niðurdráttur í lok tímabilsins var um 250 m. Nokkuð frávik er í síðustu þrýstimælingum frá reiknilíkaninu þar sem þær sýna meiri niðurdrátt en líkanið. Frumgögn eru birt í viðauka og á tölvudisklingi sem fylgir.		
<b>Lykilorð:</b> Svartsengi, jarðhitasvæði, háhiti, vinnsla, eftirlit, hiti, þrýstingur	<b>ISBN-númer:</b>	
	<b>Undirskrift verkefnisstjóra:</b> 	
	<b>Yfirfarið af:</b> SP	

## EFNISYFIRLIT

1.	INNGANGUR.....	3
2.	VINNSLA ÚR JARÐHITASVÆÐINU.....	3
3.	VATNSBORÐSMÆLINGAR.....	7
4.	REIKNILÍKAN.....	8
	MYNDIR.....	9
	VIÐAUKI: Frumgögn.....	17

## TÖFLUSKRÁ

1.	Vermi vinnsluhola í Svartsengi.....	3
2.	Holustuðlar.....	5
3.	Vinnsla úr jarðhitasvæðinu.....	5
4.	Heildarvinnsla úr einstökum holum í milljónum tonna við 5.5 bar skiljuþrýsting.....	5
5.	Niðurdæling.....	6
6.	Niðurdráttur og vinnsla.....	7
7.	Niðurdráttur og þrýstimælingar á 700 m og 1000 m dýpi í holu 7.....	7

## MYNDASKRÁ

1.	Vinnsla úr jarðhitasvæðinu í kg/s.....	10
2.	Holutoppsþrýstingur í bary.....	11
3.	Heildarvinnsla.....	12
4.	Heildarvinnsla og vatnsborð 1976-1998.....	13
5.	Vatnsborðslökkun 1976-1998.....	14
6.	Vatnsborðslökkun Reykjanesi.....	15

## 1. INNGANGUR

Þessi skýrsla er fjórtánda í röðinni sem Verkfræðistofan Vatnaskil vinnur fyrir Orkustofnun vegna Hitaveitu Suðurnesja. Efni skýrslunnar er úrvinnsla gagna um vinnslu og niðurdrátt á jarðhitasvæðinu í Svartsengi tímabilið 1. júlí 1997 - 1. júlí 1998. Öll gögn sem varða vinnslueffirlit með jarðhitasvæðinu eru skráð af starfsmönnum Hitaveitu Suðurnesja með tölvuforriti sem var gert sérstaklega fyrir hitaveituna. Forritið færir gögn í frumskrár, þar sem þau eru tiltæk til frekari úrvinnslu. Í skýrslu þessari eru dregnar saman helstu niðurstöður fyrir ofangreint tímabil.

## 2. VINNSLA ÚR JARÐHITASVÆÐINU

Vinnsla úr einstökum holum á jarðhitasvæðinu tímabilið 1. júlí 1997 - 1. júlí 1998 er sýnd á mynd 1. Holutoppsprýstingur fyrir tímabilið 1. júlí 1997 - 1. júlí 1998 er sýndur á mynd 2. Hóla 10 hefur undanfarin ár gefið hreina gufu og þyrfti því að bæta aðferðina við mælingu á rennsli úr holunni þannig að þrýstifall yfir blenduna sé mælt í stað þess að mæla eingöngu holutoppsprýsting eins og nú er gert.

Frá 19. júlí 1993 til 31. desember 1993 var dælt niður um 217,6 þúsund tonnum af þéttivatni í holu 6 í Svartsengi, eða rúmlega 15 l/s að meðaltali. Frá áramótum '93 /'94 til 30. apríl er meðalniðurdæling um 40 l/s. Frá 1. maí til 15. júní 1994 er hún hins vegar um 30 l/s. Niðurdælingu var hætt 15. júní 1994 vegna tæringar í safnæðinni við holuna. Á tímabilinu 17. apríl til 14. júní var dælt 68.670 m<sup>3</sup> niður í holu 6, þar af voru 47.174 m<sup>3</sup> þéttiraki og 21.496 m<sup>3</sup> jarðsjór. Þetta svarar til um 13 l/s meðalniðurdælingar á tímabilinu. Niðurdæling hófst aftur fimmtudaginn 19. mars 1998 um kl 14<sup>30</sup>, sjá mynd 1. Þéttivatni var dælt inn í barometriska pípu frá turni 6. Blöndunarhlutfall er nálægt 50 %. Vökvinn fer síðan í svokallaðan blöndunargeymi og er dælt frá honum í safnæð að holu 6. Sem stendur þá er dælingunni handstýrt og stillt á rúma 40 l/sek.

Síðastliðinn vetur voru gerðar afkastamælingar á borholum í Svartsengi og er niðurstöðum lýst í skýrslunni; Afkastamælingar á borholum í Svartsengi og í Eldvörpum árin 1996 og 1997 (OS-98008). Skýrslan var unnin af Orkustofnun fyrir Hitaveitu Suðurnesja. Breytingar hafa orðið á vermi sumra hola og er vermi núverandi vinnsluhola sýnt í töflu 1.

### TAFLA 1

#### Vermi vinnsluhola í Svartsengi.

Hola	Vermi
	kJ/kg
SG-7	1140
SG-8	1040
SG-9	1040
SG-11	1140
SG-12	1010

Vinnslueftirlitsforritið reiknar massastreymi einstakra hola á eftirfarandi hátt:

$$Q = e^c P_o^x \cdot \frac{\pi d^2}{4}$$

þar sem:

$P_o$  : holutoppsþrýstingur

$d$  : þvermál blendu

og  $e = 2,718$  og  $\pi = 3,142$ . Stuðlarnir  $c$  og  $x$  eru ákvarðaðir útfrá vermi borhola með útreikningum á tvífasa blendurennslu. Þessir stuðlar hafa breyst öðru hverju og eru þeir gefnir í töflu 2 fyrir einstakar holur ásamt dagsetningu þegar þeir hafa breyst.

Heildarvinnsla fyrir tímabilið er sýnd á mynd 3 og í töflu 3 er hún tekin saman frá upphafi vinnslu í Svartsengi. Í töflunni hefur niðurdæling verið dregin frá heildarvinnslu. Gufu- og vatnsstreymi einstakra hola er síðan sýnt í töflu 4 þar sem gufuhlutfall einstakra hola er sýnt miðað við 5.5 bar skiljuþrýsting. Niðurdæling í holur 5, 6 og 12 er sýnd í töflu 5. Frumgögn fyrir töflurnar eru birt í viðauka. Sömu upplýsingar er að finna á PC-tölvu disklingi, sem er í vasa innan á bakkápu. Í skránni LESTU.MIG eða LESTU.DOC er frekari upplýsingar að finna.

Eins og sést af töflunni hefur tæplega 8 milljónum tonna verið dælt niður í jarðhitasvæðið, en vinnsla er tæplega 145 milljón tonn frá upphafi vinnslu í Svartsengi.

TAFLA 2 Holustuðlar

Hola	Dags.	c	x
SG-7	700101	5.63289	1.12024
	800301	5.63786	1.13788
	831001	5.63289	1.12024
	880701	5.63355	1.12640
	980701	5.57158	1.08284
SG-8	700101	5.63289	1.12024
	830301	5.63786	1.13788
	831001	5.63289	1.12024
	880701	5.63355	1.12640
SG-9	700101	5.63289	1.12024
	830301	5.63786	1.13788
	831001	5.63289	1.12024
	880701	5.63289	1.12024
SG-10	700101	4.95706	1.00726
	840101	4.68591	1.00035
	840601	4.69526	0.99986
	880701	4.69455	0.99478
	910701	4.93547	1.00000
SG-11	700101	5.63289	1.12024
	830301	5.64123	1.15785
	831001	5.63289	1.12024
	880701	5.63355	1.12640
	980701	5.57402	1.08233
SG-12	880101	5.63289	1.12024
	880701	5.68134	1.15981
	980701	5.66121	1.12504
SG-14	910701	4.93547	1.00000

TAFLA 3 Vinnsla úr jarðhitasvæðinu

Ár	Vinnsla millj.tonn	Heildarvinnsla í árslok millj.tonn	Meðalvinnsla kg/s
1976	0,21	0,21	26,4
1977	1,07	1,28	33,9
1978	1,63	2,91	51,7
1979	3,19	6,10	101,2
1980	4,30	10,44	136,0
1981	7,48	17,92	237,2
1982	7,58	25,50	240,4
1983	7,60	33,10	241,0
1984	7,90	41,00	249,8
1985	7,75	78,75	245,8
1986	8,24	56,99	261,3
1987	8,00	64,99	253,7
1988	8,39	73,38	266,0
1989	9,05	82,43	287,0
1990	8,67	91,10	274,9
1991	8,16	99,26	258,6
1992	7,25	106,51	229,9
1993	7,22	113,73	228,9
1994	7,10	120,83	225,1
1995	8,17	129,00	259,1
1996	7,57	136,57	240,0
1997	7,70	144,27	244,2
1998*	3,53	147,80	227,0

\* Til 1. júlí 1998

TAFLA 4 Heildarvinnsla úr einstökum holum í milljónum tonna við 5.5 bar skiljuþrýsting

Tímabil	SG-7	SG-8	SG-9	SG-10	SG-11	SG-12	SG-14
Gufuhlutfall	0,231	0,182	0,182	1,000	0,231	0,169	1,000
Tímabil	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa	Vatn gufa
1976-'91	14,5 3,24	15,2 3,38	14,8 3,29	1,17 2,26	14,0 3,11	4,03 0,76	0,00 0,00
1992	1,21 0,27	1,18 0,26	1,12 0,24	0,00 0,50	0,98 0,21	0,83 0,16	0,00 0,00
1993	1,25 0,28	1,15 0,25	1,01 0,22	0,00 0,79	1,14 0,25	0,80 0,15	0,00 0,00
1994	1,47 0,33	0,99 0,22	1,10 0,24	0,00 0,83	1,36 0,30	0,84 0,16	0,00 0,00
1995	1,32 0,29	1,20 0,27	1,33 0,29	0,00 0,87	1,32 0,29	0,88 0,17	0,00 0,00
1996	1,06 0,23	1,19 0,26	1,15 0,26	0,00 0,75	1,33 0,29	0,80 0,15	0,00 0,11
1997	0,92 0,28	1,27 0,28	1,23 0,27	0,00 0,67	1,18 0,36	0,82 0,17	0,00 0,23
1998*	0,45 0,13	0,65 0,14	0,63 0,14	0,00 0,42	0,65 0,20	0,33 0,07	0,00 0,05
Samtals	22,23 5,05	22,80 5,06	22,38 4,95	1,17 7,09	21,96 5,01	9,33 1,79	0,00 0,39

\* Til 1. júlí 1998



**TAFLA 5 Niðurdæling**

Ár	Hola 12 millj.tonn	Hola 5 millj.tonn	Hola 6 millj. tonn	Meðal-niðurdæling kg/s	Heildarniður- dæling í árslok millj.tonn
1984	0,32	0	0	21,9	0,32
1985	0,94	0	0	29,8	1,26
1986	1,73	0	0	54,9	2,99
1987	1,35	0	0	42,8	4,34
1988	0,61	0,39	0	31,7	5,34
1989	0	0,45	0	14,3	5,79
1990	0	0,67	0	21,2	6,46
1991-1993	0	0	0	0	6,46
1993	0	0	0,22	15,2	6,68
1994	0	0	0,53	33,9	7,21
1995	0	0	0	0	7,21
1996	0	0	0,07	13,2	7,28
1997	0	0	0	0	7,28
1998*	0	0	0,34	21,9	7,62

\*Til 1. júlí 1998

### 3. VATNSBORÐSMÆLINGAR

Þegar vatnsborðsmælingar í holu 4 trufluðust vegna suðu í holunni var þeim hætt og þrýstimælingar notaðar til að meta þrýstilækkun á svæðinu. Í því skyni hefur þrýstingur á 700 m og 1000 m dýpi í holu 7 verið notaður. Mældur niðurdráttur og heildarvinnsla úr jarðhitasvæðinu frá upphafi eru sýnd á mynd 4. Tafla 6 sýnir niðurdrátt og vinnslu þau ár þegar vatnsborðsmælingar í holu 4 gáfu rétta mynd af niðurdrættinum.

Niðurdráttur reiknaður út frá þrýstimælingum er sýndur á mynd 4 og í töflu 7. Eins og taflan sýnir er niðurdráttur í lok júní 1998 um 250 m

TAFLA 6 Niðurdráttur og vinnsla

Ár	Meðalvinnsla kg/s	Niðurdráttur á árinu m	Mældur niður- dráttur í árslok m
1976	26,4	2,4	2,4
1977	33,9	9,2	11,6
1978	51,7	8,4	20,0
1979	101,2	10,0	30,0
1980	136,0	17,0	47,0
1981	237,2	35,4	82,4
1982	240,4	16,3	98,7
1983	241,0	19,8	118,5
1984	249,8	16,1	134,6
1985	245,8	13,4	148,0

TAFLA 7 Niðurdráttur og þrýstimælingar á 700 m og 1000 m dýpi í holu 7

Dag-setn.	Þrýstingur bar	Niður- dráttur m
79.10.28	54,04	27,0
79.11.02	53,45	33,1
79.11.23	53,84	29,1
80.01.29	54,33	24,0
80.03.04	53,64	31,1
80.10.08	51,98	48,1
82.03.15	47,37	95,5
83.05.04	45,60	113,6
84.04.30	44,03	129,7
85.04.22	43,84	131,8
86.06.03	41,49	155,8
87.04.29	41,20	158,9
87.06.03	41,50	155,7
88.10.22	40,22	168,9
89.02.14	39,5	176,3
89.97.18	37,93	192,4
90.02.05	37,84	193,3
90.07.04	37,2	199,9
90.11.15	36,98	202,1
91.03.14	36,78	204,2
91.12.10	36,18	210,3
92.03.19	36,48	207,3
92.06.11	36,58	206,2
92.09.01	36,08	211,4
92.12.21	34,10	222,7
93.06.29	35,30	210,3
93.10.08	35,30	210,3
94.11.14	60,5*	207,6
94.12.28	60,9*	203,5
95.04.27	59,7*	216,8
95.06.03	60,1*	211,7
95.11.10	60,1*	211,7
95.12.19	59,4*	218,9
96.04.02	59,0*	223,0
96.06.13	58,2*	231,0
96.09.26	58,8*	225,0
97.03.05	57,6*	237,3
97.03.05	58,4*	229,1
97.06.26	57,6*	237,3
97.09.20	57,2*	241,7
97.12.18	57,2*	241,7
98.03.31	56,7*	246,5
98.06.10	56,0*	253,8

\* þrýstingur á 1000 m dýpi

#### 4. REIKNILÍKAN

Áhrifum vaxandi niðurdráttar og niðurdælingar á vinnslu úr jarðhitasvæðinu er lýst í skýrslu sem Verkfræðistofan Vatnaskil vann fyrir Orkustofnun vegna Hitaveitu Suðurnesja (Svartsengi, Reiknilíkan af jarðhitakerfi, OS-89031/JHD-05, ágúst 1989). Í skýrslunni er gerð grein fyrir reiknilíkani, sem líkir eftir vatnsborðslækkuninni og hefur niðurstöðum þess borið vel saman við mælingar. Í ofangreindri skýrslu kom einnig fram að reiknaðri þrýstilækkun í Eldvörpum ber mjög vel saman við mælingar þar. Þannig lækkar þrýstingur í Eldvörpum jafnt og þétt með vinnslu í Svartsengi. Hins vegar sýna þrýstimælingar á Reykjanesi að lítillar þrýstilækkunar gæti þar þrátt fyrir mikla vinnslu úr svæðinu sjálfu og vinnslu í Svartsengi. Samanburður á niðurstöðum reiknilíkans og mælingum í Svartsengi er sýndur á mynd 5. Nýjasta þrýstimælingin í Svartsengi sýnir talsverðan niðurdrátt ef miðað er við að dregið hefur úr vinnslu frá mars síðastliðnum.

Mynd 6 sýnir vatnsborðslækkun í Svartsengi, Eldvörpum og Reykjanesi til ársins 2010 ef gert er ráð fyrir sömu vinnslu og var í Svartsengi og Reykjanesi árið 1998. Nýjasta þrýstimælingin í Eldvörpum frá 11. júní síðast liðnum sýnir ef til vill of mikla þrýstilækkun og er það í samræmi við þrýstimælingar í Svartsengi deginum áður. Að öðru leyti falla reikningar vel að mælingum.


**MYNDIR**

# VATNASKIL

## SVARTSENGI

## HITAVEITA SUÐURNESJA

Vinnsla úr jarðhitasvæðinu í kg/s

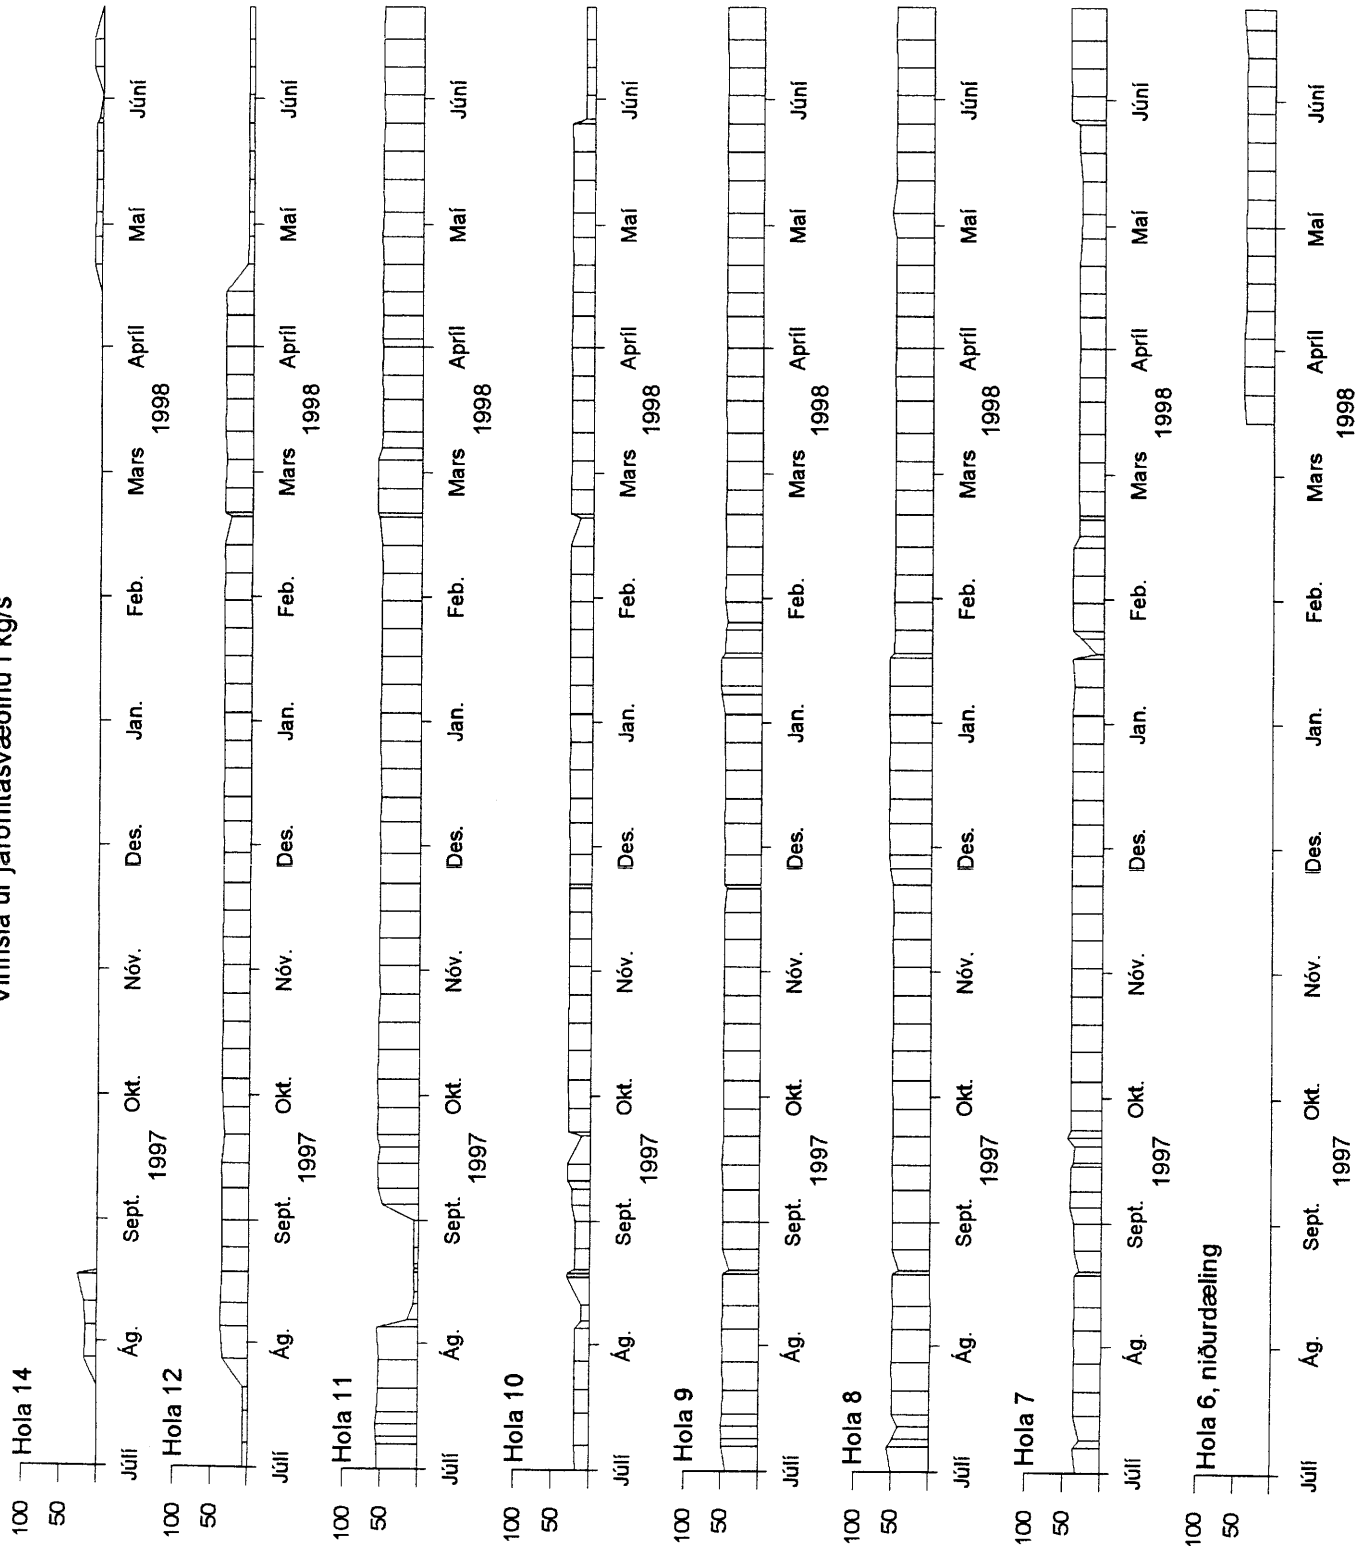


# VATNASKIL

## SVARTSENGI

## HITAVEITA SUÐURNESJA

Holutoppsbrýstingur í bary

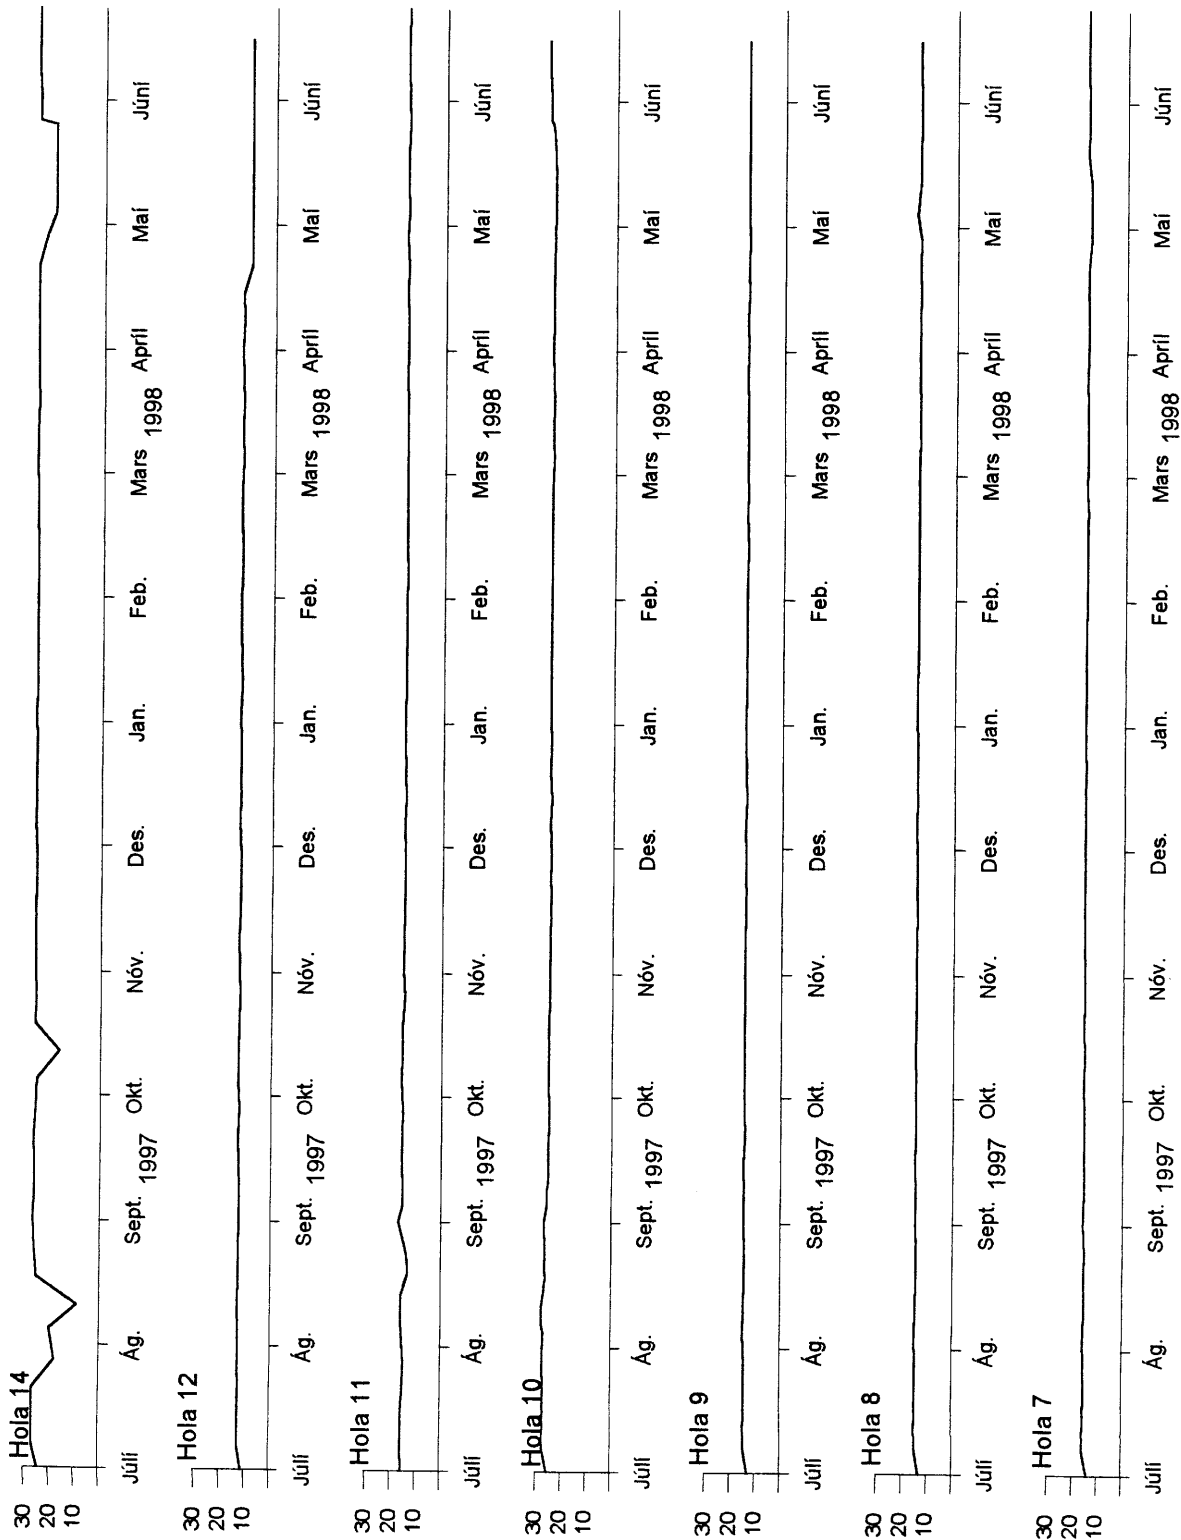


VATNASKIL

SVARTSENGI

Heildarvinnsla

HITAVEITA SUÐURNESJA

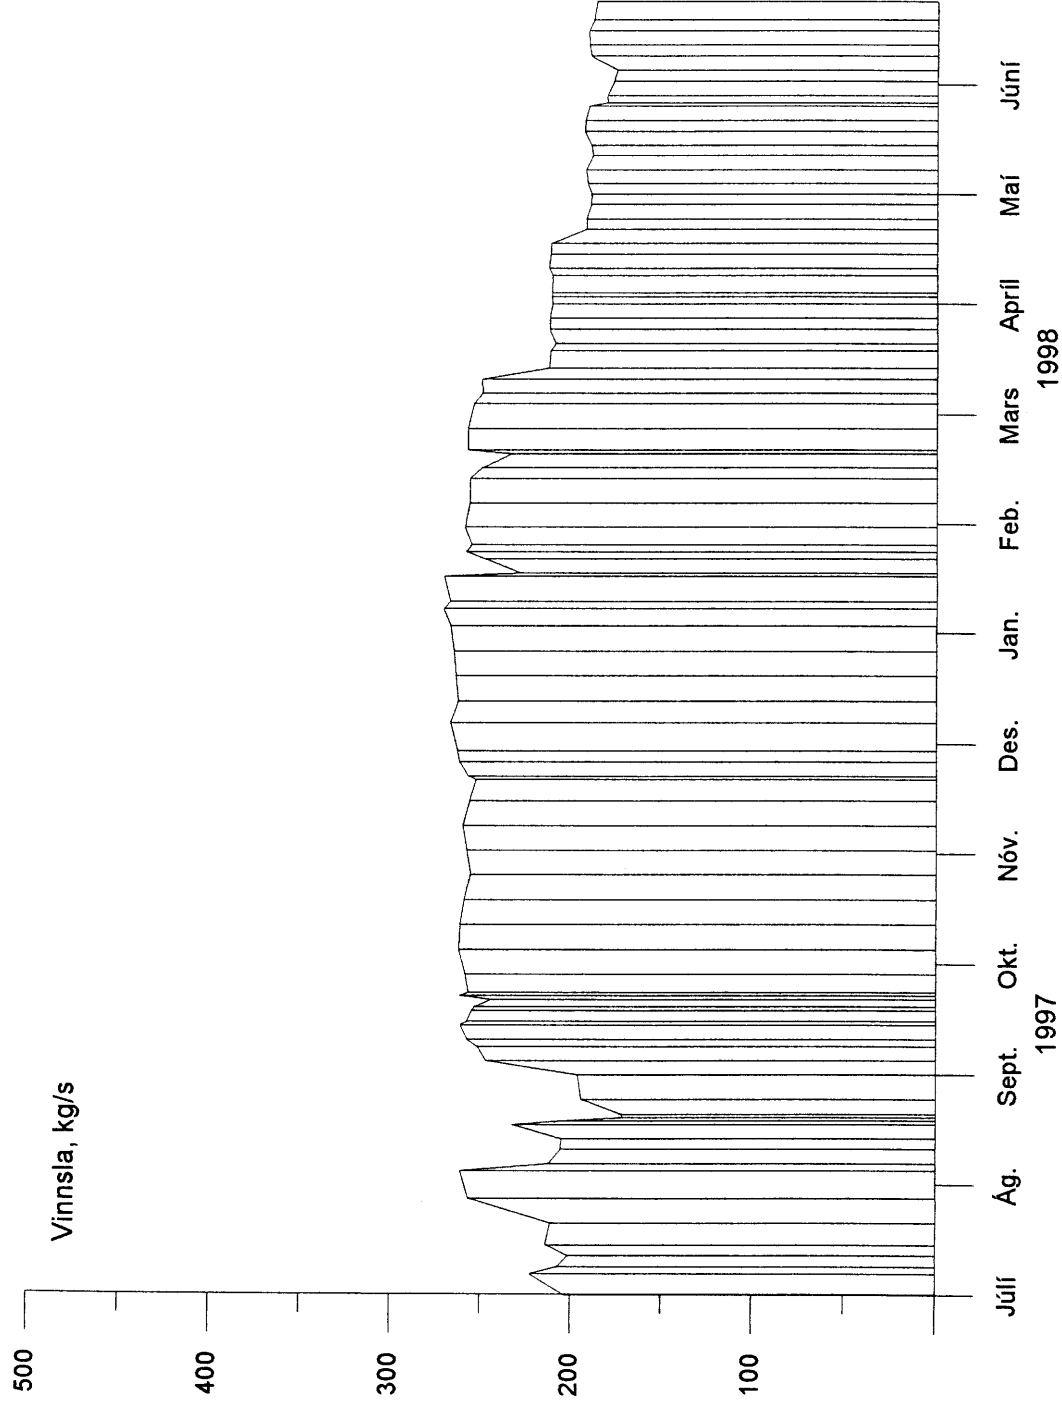


# VATNASKIL

## SVARTSENGI

# HITAVEITA SUÐURNESJA

Heildarvinnsla og vatnsborð 1976 - 1998

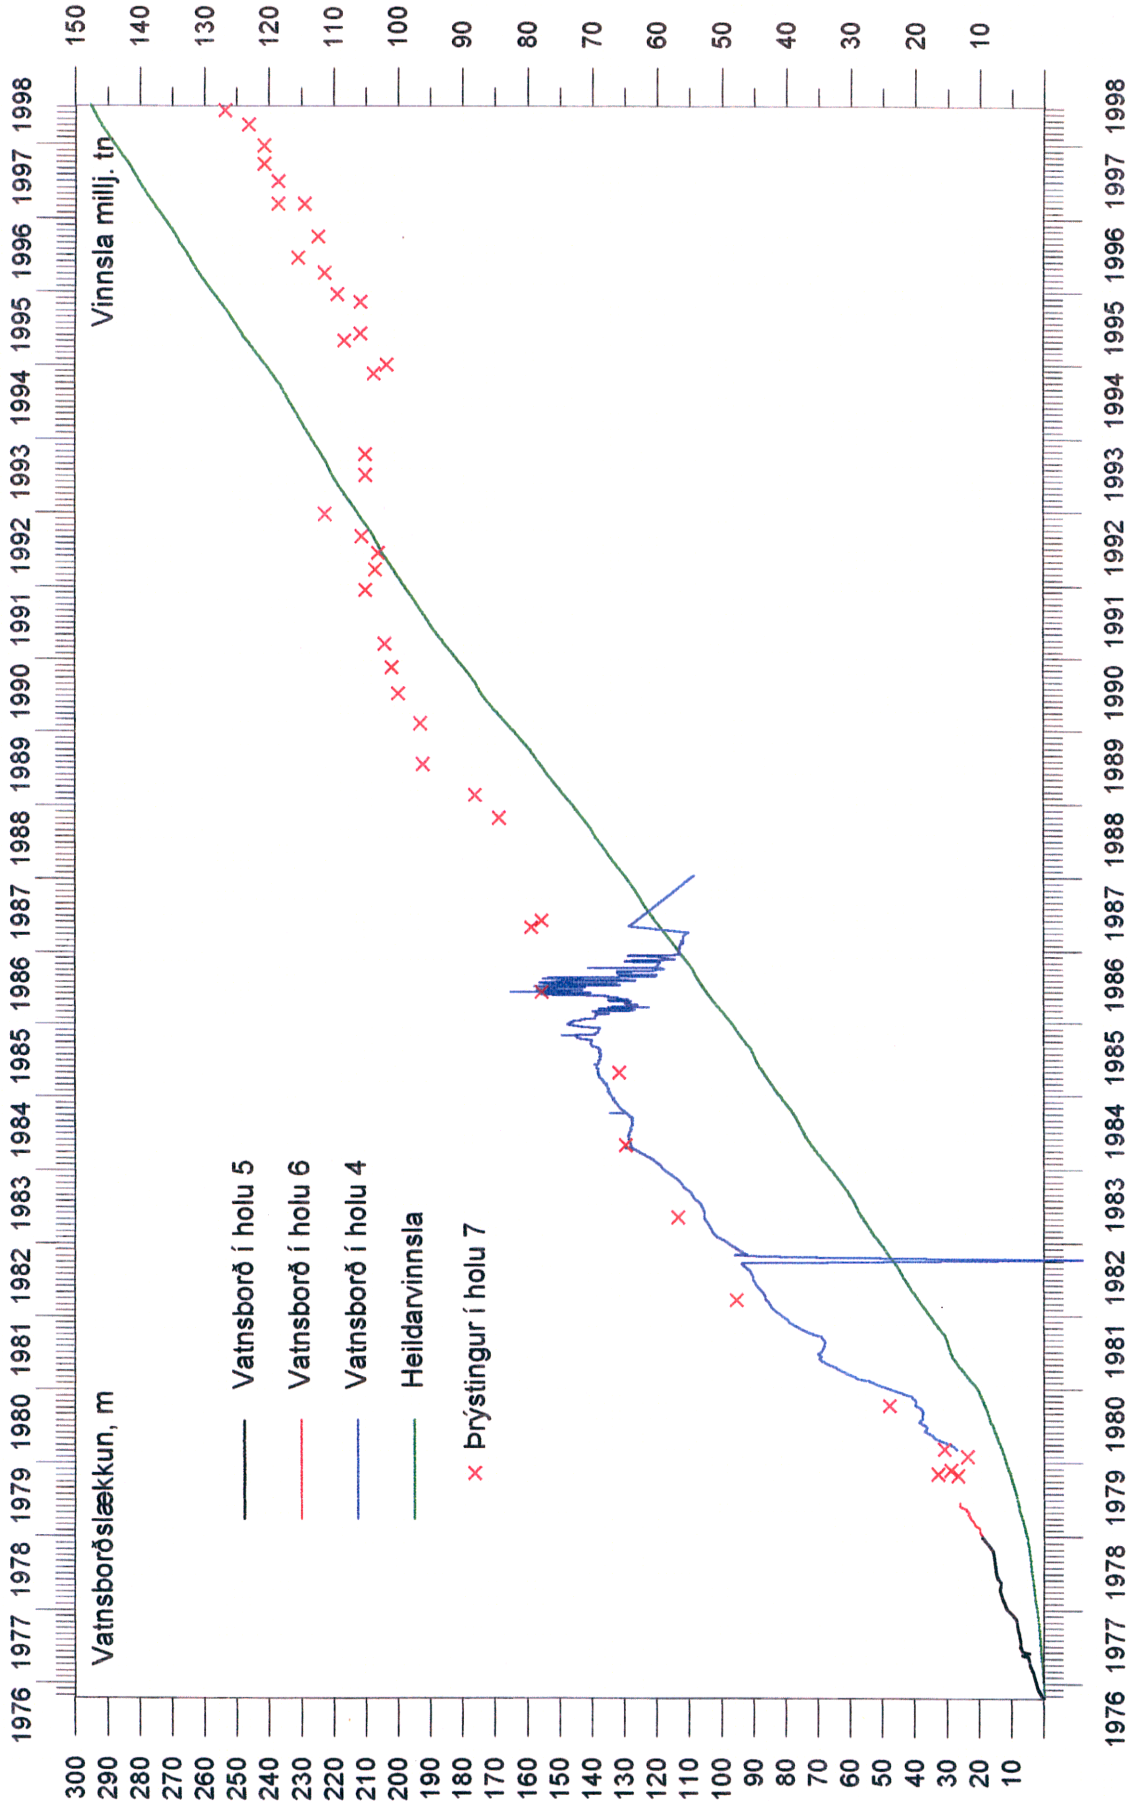




# VATNASKIL

## SVARTSENGI

## HITAVEITA SUÐURNESJA

Vatnsborðslækkun 1976 - 1998

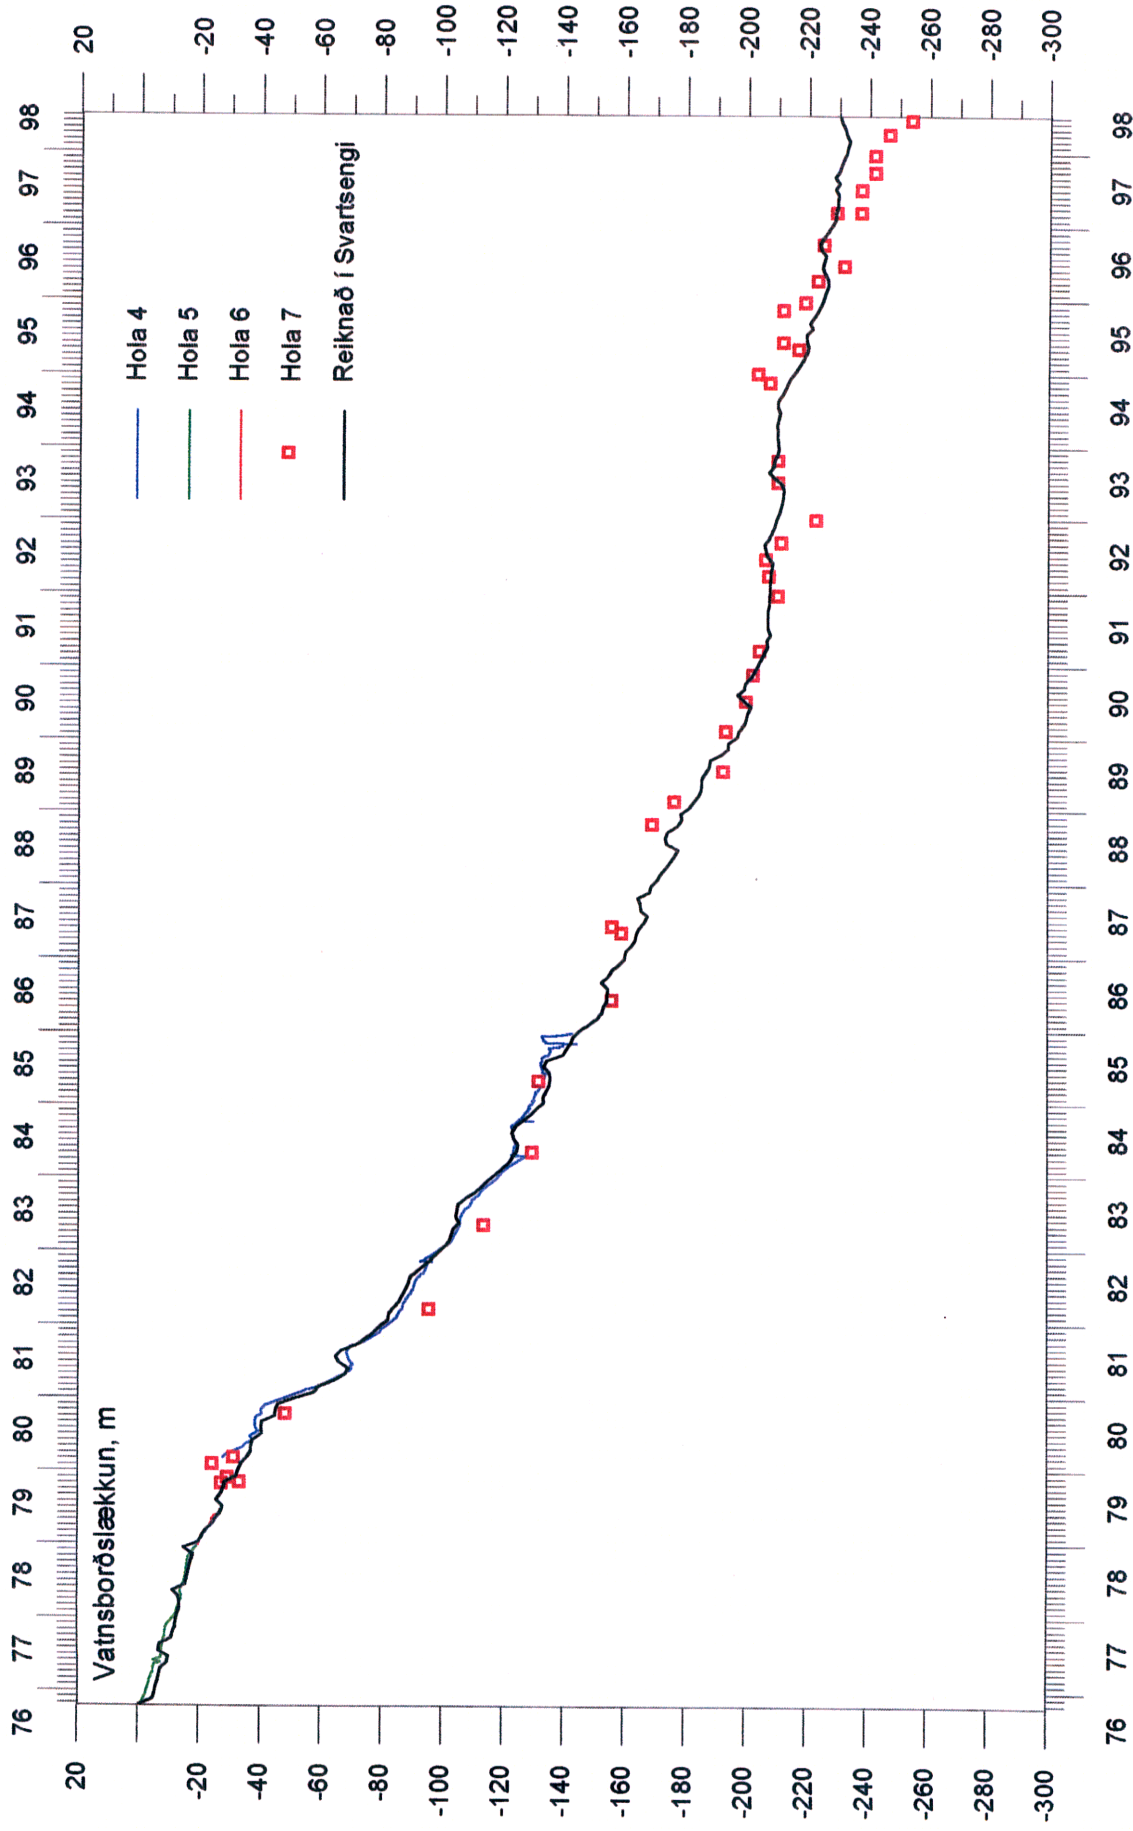


# VATNASKIL

## SVARTSENGI

## HITAVEITA SUÐURNESJA

Vatnsborðslækkun á Reykjanesi

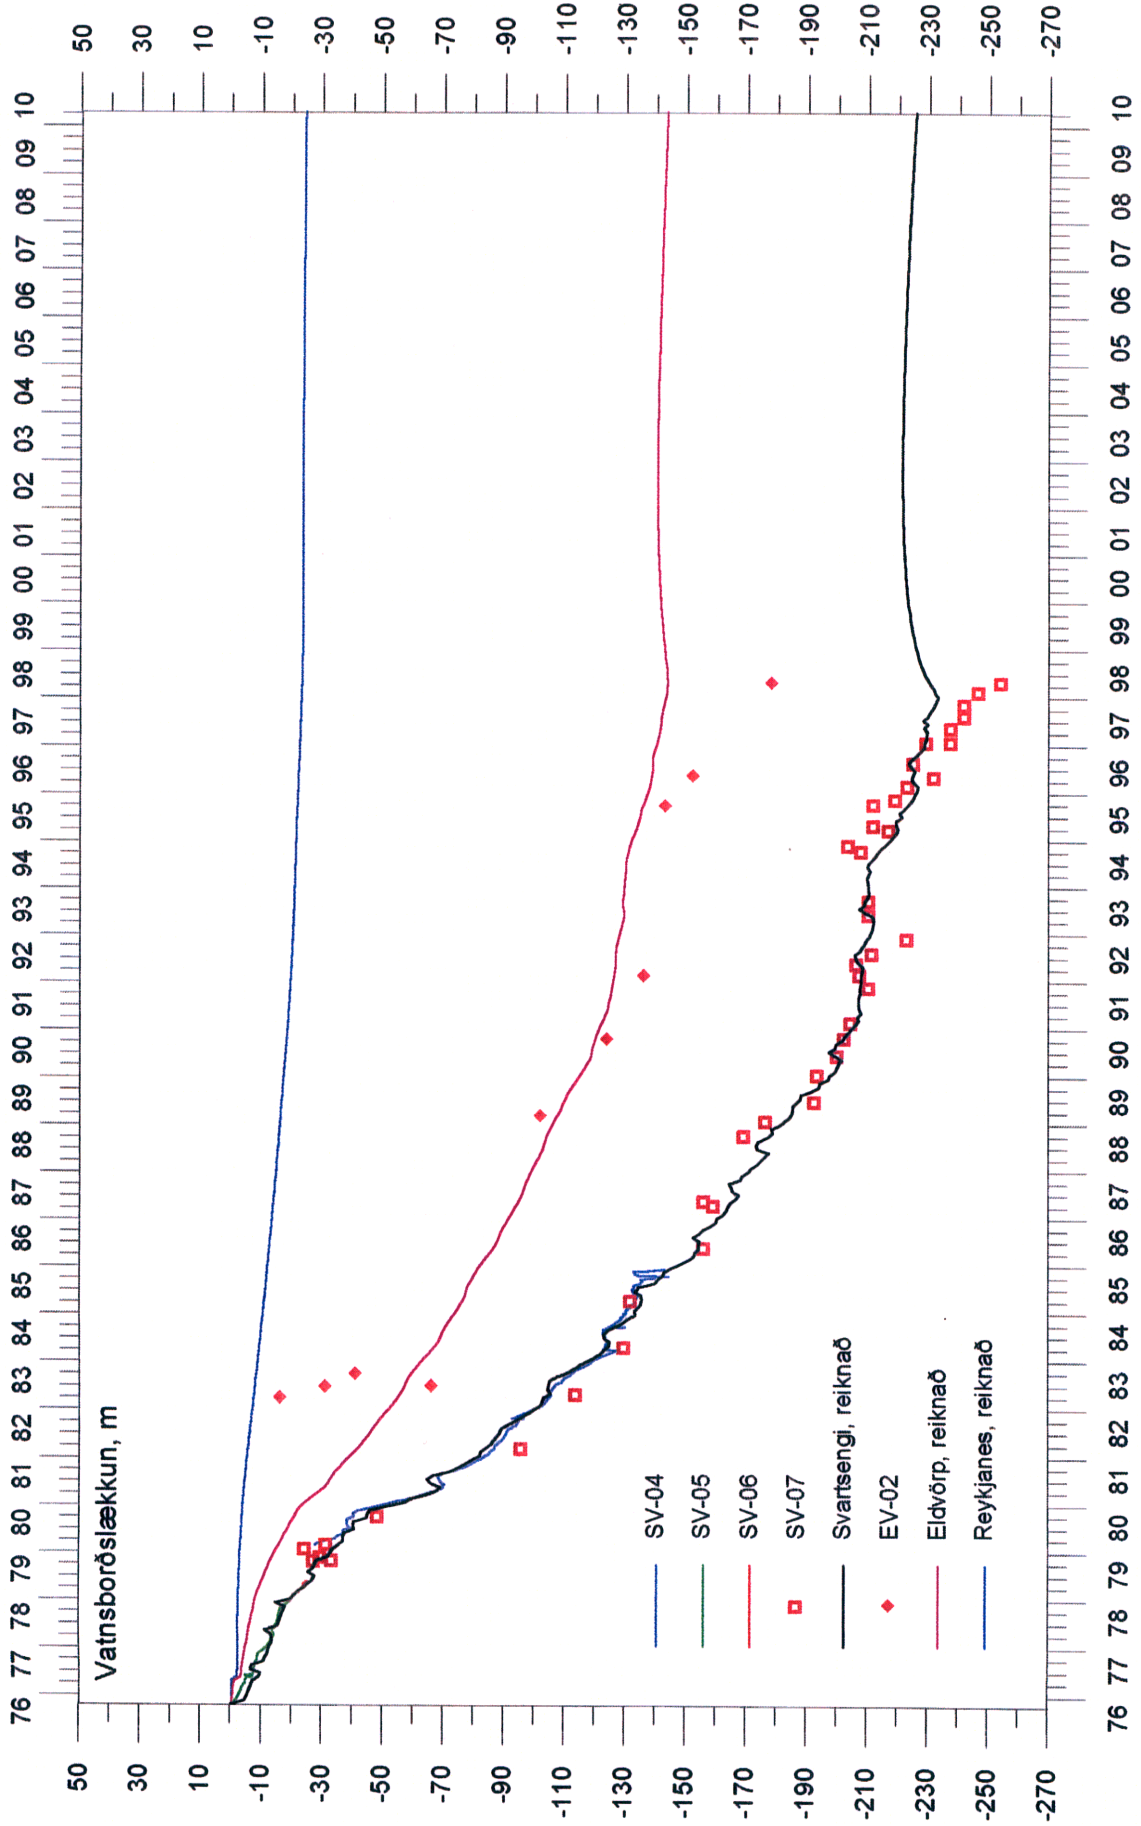

**VIÐAUKI**  
**Frumgögn**

Dags.	Niðurdæling, kg/s			Meðal- niðurdæling kg/s	Fjöldi daga	Heildar- niðurd. millj.tonn	Athugasemdir
	2:00	10:00	18:00				
98-03-19	37.00	37.00	37.00	37.00	7	.75	
98-03-26	40.00	40.00	40.00	40.00	7	.77	
98-04-02	40.00	40.00	40.00	40.00	7	.80	
98-04-09	40.00	40.00	40.00	40.00	7	.82	
98-04-16	38.00	38.00	38.00	38.00	7	.84	
98-04-23	38.00	38.00	38.00	38.00	7	.87	
98-04-30	38.00	38.00	38.00	38.00	7	.89	
98-05-07	38.50	38.50	38.50	38.50	7	.91	
98-05-14	37.50	37.50	37.50	37.50	7	.94	
98-05-21	37.00	37.00	37.00	37.00	7	.96	
98-05-28	37.50	37.50	37.50	37.50	7	.98	
98-06-04	37.00	37.00	37.00	37.00	7	1.00	
98-06-11	38.50	38.50	38.50	38.50	7	1.03	
98-06-18	37.50	37.50	37.50	37.50	7	1.05	
98-06-25	40.00	40.00	40.00	40.00	5	1.07	
98-06-30	42.00	42.00	42.00	42.00		1.09	

Dags.	Blenda stærð mm	Þrýstingur		Holan lokuð	Blenda lokunart. klst	O p n u n a r t í m i			Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar			Framhjáhl. klst	Hljóðd. klst	Holutoppur klst	
97-07-01	83.0	13.80	14.40						
97-07-07	83.0	15.70	16.30						
97-07-09	72.0	15.70	16.30				6		
97-07-15	83.0	15.40	16.10						
97-07-21	83.0	15.20	16.20						
97-07-28	83.0	15.40	16.30						
97-08-05	83.0	15.50	16.60						
97-08-11	83.0	15.40	16.10						
97-08-19	83.0	15.40	16.30						
97-08-20	83.0	15.40	16.30		24			24	Stóra stoppið
97-08-25	83.0	15.30	16.10						
97-09-01	83.0	15.70	16.60						
97-09-05	88.0	15.70	16.60						Opning í 45 sn.
97-09-09	88.0	15.40	16.20						
97-09-15	88.0	15.50	16.20						
97-09-16	88.0	15.50	16.20		10			10	Temging v/mæling
97-09-20	88.0	15.50	16.20		7			7	Afkastamaling
97-09-22	93.0	15.50	16.40						Opning í 50 sn.
97-09-24	88.0	15.50	16.40						Opning í 45 sn.
97-09-29	88.0	15.50	16.40						
97-10-06	88.0	15.80	16.40						
97-10-13	88.0	15.70	16.10						
97-10-20	88.0	15.70	16.40						
97-10-27	88.0	15.30	16.40						
97-11-03	88.0	15.60	16.30						
97-11-10	88.0	15.70	16.40						
97-11-17	88.0	15.70	16.30						
97-11-24	88.0	15.70	16.40						
97-12-01	88.0	15.70	16.30						
97-12-09	88.0	15.80	16.30						
97-12-15	88.0	15.70	16.30						
97-12-22	88.0	15.40	16.40						
97-12-29	88.0	15.70	16.50						
98-01-05	88.0	15.70	16.40						
98-01-12	88.0	15.70	16.30		11			11	
98-01-19	88.0	15.60	16.60						
98-01-20	88.0	15.60	16.60		87			87	Lokað v/breyt.
98-01-24	88.0	15.60	16.60		16			16	Aftur í notkun.
98-01-26	88.0	15.60	16.40						
98-02-02	88.0	15.50	16.30						
98-02-09	88.0	15.40	16.30						
98-02-16	88.0	15.30	16.30						
98-02-19	80.0	15.30	16.30						Nýr blendluki.
98-02-23	80.0	15.30	16.30						
98-02-24	80.0	14.90	16.30						
98-03-02	80.0	15.50	16.50						
98-03-09	80.0	15.50	16.30						
98-03-16	80.0	15.40	16.40						
98-03-24	80.0	15.50	16.30						
98-03-30	80.0	15.70	16.40						
98-04-06	80.0	15.40	16.30						
98-04-14	80.0	15.60	16.30						
98-04-20	80.0	15.60	16.30						
98-04-27	80.0	15.60	16.20						
98-05-04	80.0	14.20	15.40						
98-05-10	80.0	14.00	15.40						
98-05-18	80.0	14.10	15.30						
98-05-25	80.0	15.90	16.30						
98-06-01	80.0	15.50	16.30						
98-06-02	93.0	15.20	16.30						OV1 stopp
98-06-08	93.0	15.20	16.30						
98-06-15	93.0	15.70	16.50						
98-06-22	93.0	15.70	16.40						
98-06-30	93.0	15.70	16.40						

Dags.	Blenda stærð mm	Frýstingur		Holan lokuð	Blenda lokunart. klst	Opnunartími			Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar			Framhjáhl. klst	Hljóðd. klst	Holutoppur klst	
97-07-01	100.0	12.50	14.20			144			
97-07-07	100.0	14.40	15.60			48			
97-07-09	100.0	14.40	15.60			3			
97-07-12	100.0	14.40	15.60		14	13			Hjárás lokað
97-07-15	100.0	14.10	15.50				14		Viðgerðir
97-07-21	100.0	14.20	15.30						
97-07-28	100.0	14.40	15.50						
97-08-05	100.0	14.40	15.60						
97-08-11	100.0	14.30	15.40						
97-08-19	100.0	14.10	15.30						
97-08-20	100.0	14.10	15.30		24		24		Stóra stoppið
97-08-25	100.0	14.10	15.20						
97-09-01	100.0	14.30	15.40						
97-09-09	100.0	14.20	15.40						
97-09-15	100.0	14.60	15.40						
97-09-22	100.0	14.20	15.40						
97-09-29	100.0	14.20	15.40						
97-10-06	100.0	14.20	15.70						
97-10-13	100.0	14.40	15.60						
97-10-20	100.0	14.00	15.50						
97-10-27	100.0	14.20	15.40						
97-11-03	100.0	14.30	15.20						
97-11-10	100.0	14.40	15.40						
97-11-17	100.0	14.10	15.30						
97-11-24	100.0	14.40	15.40						
97-11-28	100.0	14.40	15.40			56			Hjárás opnuð
97-12-01	100.0	14.30	15.30			192			
97-12-09	100.0	14.50	15.50			144			
97-12-15	100.0	14.20	15.40			168			
97-12-22	100.0	14.40	15.50			168			
97-12-29	100.0	14.30	15.50			168			
98-01-05	100.0	14.40	15.60			168			
98-01-12	100.0	14.40	15.60			168			
98-01-19	100.0	14.30	15.60			24			
98-01-20	100.0	14.30	15.60			16			Hjárás lokað.
98-01-26	100.0	14.20	15.50						
98-02-02	100.0	14.40	15.50						
98-02-09	100.0	14.30	15.40						
98-02-16	100.0	14.30	15.40						
98-02-24	100.0	14.20	15.50						
98-03-02	100.0	14.20	15.50						
98-03-09	100.0	14.10	15.40						
98-03-16	100.0	14.00	15.40						
98-03-24	100.0	13.90	15.40						
98-03-30	100.0	14.40	15.40						
98-04-06	100.0	14.30	15.40						
98-04-14	100.0	14.30	15.40						
98-04-20	100.0	13.90	15.40						
98-04-27	100.0	14.30	15.40						
98-05-04	100.0	14.00	15.30						
98-05-10	100.0	15.80	16.40						
98-05-18	100.0	14.20	15.30						
98-05-25	100.0	14.40	15.40						
98-06-01	100.0	14.00	15.30						
98-06-08	100.0	14.00	15.40						
98-06-15	100.0	14.20	15.50						
98-06-22	100.0	14.20	15.60						
98-06-30	100.0	14.20	15.50						

Dags.	Blenda stærð mm	Þrýstingur		Holan lokuð	Blenda lokunart. klst	O p n u n a r t í m i			Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar			Framhjáhl. klst	Hljóðd. klst	Holutoppur klst	
97-07-01	100.0	12.60	13.80						
97-07-07	100.0	14.40	15.70						
97-07-09	100.0	14.40	15.70				4		
97-07-12	100.0	14.40	15.70				13		
97-07-15	100.0	14.00	15.50						
97-07-21	100.0	14.00	15.20						
97-07-28	100.0	14.20	15.30						
97-08-05	100.0	14.50	15.70						
97-08-11	100.0	14.30	15.50						
97-08-19	100.0	14.30	15.30						
97-08-20	100.0	14.30	15.30		24			24	Stóra stoppið
97-08-25	100.0	14.30	15.30						
97-09-01	100.0	14.30	15.50						
97-09-09	100.0	14.20	15.50						
97-09-15	100.0	14.70	15.70						
97-09-22	100.0	14.20	15.40						
97-09-29	100.0	14.30	15.50						
97-10-06	100.0	14.30	15.60						
97-10-13	100.0	14.30	15.70						
97-10-20	100.0	14.20	15.50						
97-10-27	100.0	14.30	15.40						
97-11-03	100.0	14.40	15.40						
97-11-10	100.0	14.40	15.40						
97-11-17	100.0	14.20	15.40						
97-11-23	100.0	14.20	15.40		2			2	Diskur fór
97-11-24	100.0	14.30	15.50						
97-12-01	100.0	14.30	15.40						
97-12-09	100.0	14.60	15.60						
97-12-15	100.0	14.20	15.40						
97-12-22	100.0	14.40	15.50						
97-12-29	100.0	14.60	15.60						
98-01-05	100.0	14.60	15.60						
98-01-10	100.0	14.30	15.40				38		Hjárás opnuð.
98-01-12	100.0	14.30	15.40				168		
98-01-19	100.0	14.30	15.40				24		
98-01-20	100.0	14.60	15.40				16		Hjárás lokað.
98-01-26	100.0	14.20	15.50						
98-01-28	100.0	14.60	15.50		10			10	Viðgerðir.
98-02-02	100.0	14.60	15.50						
98-02-09	100.0	14.30	15.40						
98-02-16	100.0	14.20	15.40						
98-02-24	100.0	14.70	15.60						
98-03-02	100.0	14.30	15.40						
98-03-09	100.0	14.30	15.40						
98-03-16	100.0	14.40	15.40						
98-03-24	100.0	14.50	15.50						
98-03-30	100.0	14.70	15.50						
98-04-06	100.0	14.30	15.40						
98-04-14	100.0	14.50	15.70						
98-04-20	100.0	14.30	15.30						
98-04-27	100.0	14.40	15.40						
98-05-04	100.0	14.20	15.40						
98-05-10	100.0	14.30	15.40						
98-05-18	100.0	14.30	15.40						
98-05-25	100.0	14.60	15.50						
98-06-01	100.0	14.30	15.40						
98-06-08	100.0	14.30	15.40						
98-06-15	100.0	14.50	15.40						
98-06-22	100.0	14.50	15.50						
98-06-30	100.0	14.40	15.50						

Dags.	Blenda stærð mm	Frýstingur		Holan lokuð	Blenda lokunart. klst	O p n u n a r t í m i			Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar			Framhjáhl. klst	Hljóðd. klst	Holutoppur klst	
97-07-01	79.0	25.50	25.50						
97-07-07	79.0	27.50	27.50						
97-07-15	79.0	27.40	27.40						
97-07-21	79.0	27.20	27.20						
97-07-28	79.0	27.70	27.70						
97-08-05	79.0	27.30	27.30						
97-08-07	60.0	28.00	28.00						Örengt að loka
97-08-11	60.0	28.00	28.00						
97-08-18	99.0	26.60	26.60						H101 opnað
97-08-19	99.0	26.60	26.60						
97-08-20	80.0	26.90	26.90						Minnkað við H102
97-08-25	80.0	26.90	26.90						
97-09-01	80.0	27.00	27.00						
97-09-05	90.0	26.10	26.10						Aukið við H102
97-09-09	90.0	26.10	26.10						
97-09-11	101.2	25.50	25.50						Fullopið H102
97-09-15	101.2	25.50	25.50						
97-09-22	63.2	25.50	25.50						H101 lokað
97-09-23	101.2	25.30	25.30						H101 opnuð
97-09-29	101.2	25.30	25.30						
97-10-06	101.2	25.40	25.40						
97-10-13	101.2	25.40	25.40						
97-10-20	101.2	25.50	25.50						
97-10-27	101.2	25.20	25.20						
97-11-03	101.2	25.20	25.20						
97-11-10	101.2	25.30	25.30						
97-11-17	101.2	25.00	25.00						
97-11-23	101.2	25.00	25.00						H102 úti 1 klst
97-11-24	101.2	25.20	25.20						
97-12-01	101.2	25.10	25.10						
97-12-09	101.2	25.50	25.50						
97-12-15	101.2	25.10	25.10						
97-12-22	101.2	25.40	25.40						
97-12-29	101.2	25.20	25.20						
98-01-05	101.2	25.50	25.50						
98-01-12	101.2	25.50	25.50						
98-01-19	101.2	25.40	25.40						
98-01-26	101.2	25.50	25.50						
98-02-02	101.2	25.40	25.40						
98-02-09	101.2	25.40	25.40						
98-02-16	101.2	25.40	25.40						
98-02-23	101.2	25.40	25.40		10				Breytt keyrsla.
98-02-24	101.2	25.40	25.40						
98-03-02	101.2	25.40	25.40						
98-03-09	101.2	25.00	25.00						
98-03-16	101.2	25.20	25.20						
98-03-24	101.2	25.10	25.10						
98-03-30	101.2	25.30	25.30						
98-04-06	101.2	25.40	25.40						
98-04-14	101.2	25.20	25.20						
98-04-20	101.2	25.20	25.20						
98-04-27	101.2	25.20	25.20		8				Keyrð með H-14
98-05-04	101.2	25.00	25.00						
98-05-10	101.2	24.70	24.70						
98-05-18	101.2	24.80	24.80						
98-05-25	101.2	24.90	24.90						
98-06-01	101.2	25.80	25.80						
98-06-02	63.2	26.80	26.80						H10/1 lokuð.
98-06-08	63.2	26.80	26.80						
98-06-15	63.2	27.30	27.30						
98-06-22	63.2	27.30	27.30						
98-06-30	63.2	27.30	27.30						



Dags.	Blenda stærð mm	Þrýstingur		Holan lokuð	Blenda lokunart. klst	O p n u n a r t í m i			Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar			Framhjáhl. klst	Hljóðd. klst	Holutoppur klst	
97-07-01	102.0	15.00	16.30						
97-07-07	102.0	15.40	16.40						
97-07-09	102.0	15.40	16.40				6		
97-07-12	102.0	15.40	16.40				13		
97-07-15	102.0	15.20	16.50						
97-07-21	102.0	14.70	16.10						
97-07-28	102.0	14.80	15.50						
97-08-05	102.0	15.20	16.40						
97-08-07	102.0	16.10	16.10		81	81			Hjárás eingöngu
97-08-11	102.0	16.10	16.10		72	72			
97-08-14	102.0	16.10	16.10		120	116			Körfumáling
97-08-19	102.0	12.40	14.90		24	24			Hjárás eingöngu
97-08-20	102.0	12.40	14.90		24	7	15		Stóra stoppið
97-08-21	102.0	12.40	14.90		96	90	6		
97-08-25	102.0	14.30	14.30		168	168			
97-09-01	102.0	17.00	17.30		96	96			
97-09-05	102.0	14.60	16.70		13	13			Opnað á blendu
97-09-09	102.0	14.60	16.70						
97-09-15	102.0	15.30	16.30						
97-09-19	102.0	15.30	16.30		3				Diskur fór
97-09-22	102.0	15.20	16.50			22			
97-09-29	102.0	15.20	16.30						
97-10-06	102.0	15.60	16.70						
97-10-13	102.0	15.30	16.50						
97-10-20	102.0	15.10	16.50						
97-10-27	102.0	14.20	16.20						
97-11-03	102.0	15.10	16.10						
97-11-10	102.0	15.00	16.40						
97-11-17	102.0	14.20	16.70						
97-11-24	102.0	14.20	16.50						
97-12-01	102.0	14.30	16.60						
97-12-09	102.0	14.70	16.70						
97-12-15	102.0	14.20	16.10						
97-12-22	102.0	14.30	16.50						
97-12-29	102.0	14.40	16.70						
98-01-05	102.0	14.60	16.60						
98-01-12	102.0	14.30	16.40						
98-01-19	102.0	14.20	16.60						
98-01-26	102.0	14.30	16.60						
98-02-02	102.0	14.40	16.40						
98-02-09	102.0	14.30	16.20						
98-02-16	102.0	14.20	16.40						
98-02-23	102.0	14.40	16.50				14		Hjárás opnuð.
98-02-24	102.0	14.40	16.50				144		
98-03-02	102.0	14.40	16.50				168		
98-03-09	102.0	14.30	16.30				72		
98-03-12	102.0	14.30	16.40				13		Hjárás lokað.
98-03-16	102.0	14.30	16.40						
98-03-24	102.0	14.30	16.40						
98-03-30	102.0	14.60	16.60						
98-04-06	102.0	14.40	16.50						
98-04-08	102.0	14.40	16.50				8		Hjárás opn/lokað
98-04-14	102.0	14.40	16.50						
98-04-20	102.0	14.40	16.70						
98-04-27	102.0	14.40	16.40						
98-05-04	102.0	14.80	16.80						
98-05-10	102.0	13.90	16.80						
98-05-18	102.0	14.50	16.70						
98-05-25	102.0	14.40	16.60						
98-06-01	102.0	14.10	16.40						
98-06-08	102.0	14.40	16.40						
98-06-15	102.0	14.40	16.60						
98-06-22	102.0	14.40	16.60						
98-06-30	102.0	14.40	16.50						

Dags.	Blenda stærð mm	Þrýstingur		Holan lokuð	Blenda lokunart. klst	Opnunartími			Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar			Framhjáhl. klst	Hljóðd. klst	Holutoppur klst	
97-07-01	85.0	10.70	11.70		144			144	
97-07-07	85.0	12.40	13.40		192			192	
97-07-15	85.0	12.40	13.40		144			144	
97-07-21	85.0	12.40	13.40		168			168	
97-07-28	85.0	12.80	13.60		13			13	
97-08-05	85.0	12.80	13.60						Opnað á blendu
97-08-11	85.0	12.60	14.20						
97-08-19	85.0	12.60	13.50						
97-08-25	85.0	12.50	13.60						
97-09-01	85.0	12.30	13.60						
97-09-09	85.0	12.30	13.50						
97-09-15	85.0	12.60	13.80						
97-09-22	85.0	13.00	13.90		21			21	OV1 v/rakaskilju
97-09-29	85.0	12.50	13.50						
97-10-06	85.0	12.80	13.90						
97-10-13	85.0	12.90	13.90						
97-10-20	85.0	12.40	13.80						
97-10-27	85.0	12.40	13.40						
97-11-03	85.0	12.70	13.50						
97-11-10	85.0	12.70	13.90						
97-11-17	85.0	12.40	13.50						
97-11-24	85.0	12.40	13.40						
97-12-01	85.0	12.40	13.50						
97-12-09	85.0	12.80	13.80						
97-12-15	85.0	12.80	13.70						
97-12-22	85.0	12.30	13.80						
97-12-29	85.0	12.40	13.80						
98-01-05	85.0	12.80	13.90						
98-01-12	85.0	12.40	13.50						
98-01-19	85.0	12.40	13.90						
98-01-26	85.0	12.80	13.80						
98-02-02	85.0	12.90	13.80						
98-02-09	85.0	12.40	13.80						
98-02-16	85.0	12.60	13.70						
98-02-23	85.0	12.90	13.90		7			7	Breyting.
98-02-24	85.0	12.90	13.90						
98-03-02	85.0	12.90	13.90						
98-03-09	85.0	12.30	13.40						
98-03-16	85.0	12.70	13.70						
98-03-24	85.0	12.40	13.50						
98-03-30	85.0	12.70	13.60						
98-04-06	85.0	12.80	13.90						
98-04-14	85.0	12.50	13.50						
98-04-20	85.0	12.70	13.70						
98-04-27	85.0	9.80	9.80		155			155	Tekin úr notkun.
98-05-04	85.0	9.80	9.80		144			144	
98-05-10	85.0	9.80	9.80		192			192	
98-05-18	85.0	9.80	9.80		168			168	
98-05-25	85.0	9.80	9.80		168			168	
98-06-01	85.0	9.80	9.80		168			168	
98-06-08	85.0	9.80	9.80		168			168	
98-06-15	85.0	9.80	9.80		168			168	
98-06-22	85.0	9.80	9.80		192			192	
98-06-30	85.0	9.80	9.80		144			144	

Dags.	Blenda stærð mm	Þrýstingur		Holan lokuð	Blenda lokunart. klst	Opnunartími			Athugasemdir
		P-min bar	P-max bar			Framhjahl. klst	Hljóðd. klst	Holutoppur klst	
97-07-01	124.0	24.80	24.80		144				
97-07-07	124.0	27.10	27.10		192				Gamli mælir
97-07-15	124.0	26.90	26.90		144				Leiðrétt mæling
97-07-21	124.0	27.00	27.00		168				
97-07-28	90.0	18.30	18.30		9				
97-08-05	80.0	20.30	20.30						
97-08-11	124.0	9.20	9.20						
97-08-18	124.0	25.80	25.80		10				H102 í notkun
97-08-19	124.0	25.80	25.80		144				
97-08-25	124.0	26.60	26.60		168				
97-09-01	124.0	26.90	26.90		192				
97-09-09	124.0	26.70	26.70		144				
97-09-15	124.0	26.80	26.80		168				
97-09-22	124.0	26.90	26.90		168				
97-09-29	124.0	26.40	26.40		168				
97-10-06	124.0	25.80	25.80		168				
97-10-13	124.0	16.70	16.70		168				
97-10-20	124.0	26.50	26.50		168				
97-10-27	124.0	26.40	26.40		168				
97-11-03	124.0	26.50	26.50		168				
97-11-10	124.0	26.60	26.60		168				
97-11-17	124.0	26.50	26.50		168				
97-11-24	124.0	26.40	26.40		168				
97-12-01	124.0	26.40	26.40		192				
97-12-09	124.0	26.80	26.80		144				
97-12-15	124.0	26.50	26.50		168				
97-12-22	124.0	26.50	26.50		168				
97-12-29	124.0	26.60	26.60		168				
98-01-05	124.0	26.70	26.70		168				Enn lokuð.
98-01-12	124.0	26.60	26.60		168				
98-01-19	124.0	26.60	26.60		168				
98-01-26	124.0	26.60	26.60		168				
98-02-02	124.0	26.60	26.60		168				
98-02-09	124.0	26.50	26.60		168				
98-02-16	124.0	26.60	26.60		192				
98-02-24	124.0	26.80	26.80		144				
98-03-02	124.0	26.80	26.80		168				
98-03-09	124.0	26.90	26.90		168				
98-03-16	124.0	27.10	27.10		192				
98-03-24	124.0	26.60	26.60		144				
98-03-30	124.0	26.70	26.70		168				
98-04-06	124.0	26.70	26.70		192				
98-04-14	124.0	26.80	26.80		144				
98-04-20	124.0	26.80	26.80		168				
98-04-27	60.0	26.70	26.70		20				Tekin inn á OV1.
98-05-04	62.0	23.80	23.80		10				Ný blenda.
98-05-10	62.0	20.00	20.00						
98-05-18	62.0	20.00	20.00						
98-05-25	62.0	20.00	20.00						
98-06-01	62.0	20.00	20.00						
98-06-02	62.0	26.50	26.50		84				OV1 stöðvað.
98-06-08	62.0	26.50	26.50		168				Holan lokuð.
98-06-15	62.0	27.10	27.10						
98-06-22	62.0	27.10	27.10						
98-06-30	62.0	27.20	27.20						

Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal- þrýstingur bar	Meðal- Blenda kg/s	Meðal- Annað kg/s	Heildar Heildar kg/s	Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
97-07-01	6	14.10	32.20	.00	32.20	25.87	
97-07-07	2	16.00	36.80	.00	36.80	25.89	
97-07-09	6	16.00	27.69	.25	27.94	25.89	
97-07-15	6	15.75	36.19	.00	36.19	25.91	
97-07-21	7	15.70	36.07	.00	36.07	25.93	
97-07-28	8	15.85	36.43	.00	36.43	25.95	
97-08-05	6	16.05	36.92	.00	36.92	25.97	
97-08-11	8	15.75	36.19	.00	36.19	25.99	
97-08-19	1	15.85	36.43	.00	36.43	26.02	
97-08-20	5	15.85	29.15	1.20	30.35	26.02	Stóra stoppið
97-08-25	7	15.70	36.07	.00	36.07	26.03	
97-09-01	4	16.15	37.17	.00	37.17	26.05	
97-09-05	4	16.15	41.78	.00	41.78	26.07	Opning í 45 sn.
97-09-09	6	15.80	40.82	.00	40.82	26.08	
97-09-15	1	15.85	40.96	.00	40.96	26.10	
97-09-16	4	15.85	36.69	.63	37.31	26.11	Temging v/maling
97-09-20	2	15.85	34.98	.88	35.86	26.12	Afkastamaling
97-09-22	2	15.95	46.05	.00	46.05	26.13	Opning í 50 sn.
97-09-24	5	15.95	41.23	.00	41.23	26.13	Opning í 45 sn.
97-09-29	7	15.95	41.23	.00	41.23	26.15	
97-10-06	7	16.10	41.64	.00	41.64	26.18	
97-10-13	7	15.90	41.09	.00	41.09	26.20	
97-10-20	7	16.05	41.50	.00	41.50	26.23	
97-10-27	7	15.85	40.96	.00	40.96	26.25	
97-11-03	7	15.95	41.23	.00	41.23	26.28	
97-11-10	7	16.05	41.50	.00	41.50	26.30	
97-11-17	7	16.00	41.37	.00	41.37	26.33	
97-11-24	7	16.05	41.50	.00	41.50	26.35	
97-12-01	8	16.00	41.37	.00	41.37	26.38	
97-12-09	6	16.05	41.50	.00	41.50	26.41	
97-12-15	7	16.00	41.37	.00	41.37	26.43	
97-12-22	7	15.90	41.09	.00	41.09	26.45	
97-12-29	7	16.10	41.64	.00	41.64	26.48	
98-01-05	7	16.05	41.50	.00	41.50	26.50	
98-01-12	7	16.00	38.66	.39	39.05	26.53	
98-01-19	1	16.10	41.64	.00	41.64	26.55	
98-01-20	4	16.10	3.90	5.44	9.34	26.55	Lokað v/breyt.
98-01-24	2	16.10	27.76	2.00	29.76	26.56	Aftur í notkun.
98-01-26	7	16.00	41.37	.00	41.37	26.56	
98-02-02	7	15.90	41.09	.00	41.09	26.59	
98-02-09	7	15.85	40.96	.00	40.96	26.61	
98-02-16	3	15.80	40.82	.00	40.82	26.64	
98-02-19	4	15.80	33.73	.00	33.73	26.65	Nýr blenduloki.
98-02-23	1	15.80	33.73	.00	33.73	26.66	
98-02-24	6	15.60	33.28	.00	33.28	26.66	
98-03-02	7	16.00	34.19	.00	34.19	26.68	
98-03-09	7	15.90	33.96	.00	33.96	26.70	
98-03-16	8	15.90	33.96	.00	33.96	26.72	
98-03-24	6	15.90	33.96	.00	33.96	26.74	
98-03-30	7	16.05	34.30	.00	34.30	26.76	
98-04-06	8	15.85	33.85	.00	33.85	26.78	
98-04-14	6	15.95	34.07	.00	34.07	26.81	
98-04-20	7	15.95	34.07	.00	34.07	26.82	
98-04-27	7	15.90	33.96	.00	33.96	26.84	
98-05-04	6	14.80	31.48	.00	31.48	26.86	
98-05-10	8	14.70	31.26	.00	31.26	26.88	
98-05-18	7	14.70	31.26	.00	31.26	26.90	
98-05-25	7	16.10	34.41	.00	34.41	26.92	
98-06-01	1	15.90	33.96	.00	33.96	26.94	
98-06-02	6	15.75	45.44	.00	45.44	26.95	OV1 stopp
98-06-08	7	15.75	45.44	.00	45.44	26.97	
98-06-15	7	16.10	46.51	.00	46.51	27.00	
98-06-22	8	16.05	46.35	.00	46.35	27.02	
98-06-30		16.05				27.06	

Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal- þrýstingur bar	Meðal- Blenda kg/s	Meðal- Annað kg/s	Heildar- Heildar kg/s	Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
97-07-01	6	13.35	44.14	6.00	50.14	26.29	
97-07-07	2	15.00	49.89	6.00	55.89	26.32	
97-07-09	3	15.00	47.81	1.08	48.90	26.33	Hjárás lokað
97-07-12	3	15.00	40.19	1.17	41.36	26.34	Viðgerðir
97-07-15	6	14.80	49.19	.00	49.19	26.35	
97-07-21	7	14.75	49.01	.00	49.01	26.38	
97-07-28	8	14.95	49.72	.00	49.72	26.41	
97-08-05	6	15.00	49.89	.00	49.89	26.44	
97-08-11	8	14.85	49.37	.00	49.37	26.47	
97-08-19	1	14.70	48.84	.00	48.84	26.50	
97-08-20	5	14.70	39.07	1.20	40.27	26.51	Stóra stoppið
97-08-25	7	14.65	48.66	.00	48.66	26.52	
97-09-01	8	14.85	49.37	.00	49.37	26.55	
97-09-09	6	14.80	49.19	.00	49.19	26.59	
97-09-15	7	15.00	49.89	.00	49.89	26.61	
97-09-22	7	14.80	49.19	.00	49.19	26.64	
97-09-29	7	14.80	49.19	.00	49.19	26.67	
97-10-06	7	14.95	49.72	.00	49.72	26.70	
97-10-13	7	15.00	49.89	.00	49.89	26.73	
97-10-20	7	14.75	49.01	.00	49.01	26.76	
97-10-27	7	14.80	49.19	.00	49.19	26.79	
97-11-03	7	14.75	49.01	.00	49.01	26.82	
97-11-10	7	14.90	49.54	.00	49.54	26.85	
97-11-17	7	14.70	48.84	.00	48.84	26.88	
97-11-24	4	14.90	49.54	.00	49.54	26.91	
97-11-28	3	14.90	49.54	4.67	54.21	26.93	Hjárás opnuð
97-12-01	8	14.80	49.19	6.00	55.19	26.94	
97-12-09	6	15.00	49.89	6.00	55.89	26.98	
97-12-15	7	14.80	49.19	6.00	55.19	27.01	
97-12-22	7	14.95	49.72	6.00	55.72	27.04	
97-12-29	7	14.90	49.54	6.00	55.54	27.08	
98-01-05	7	15.00	49.89	6.00	55.89	27.11	
98-01-12	7	15.00	49.89	6.00	55.89	27.14	
98-01-19	1	14.95	49.72	6.00	55.72	27.18	
98-01-20	6	14.95	49.72	.67	50.38	27.18	Hjárás lokað.
98-01-26	7	14.85	49.37	.00	49.37	27.21	
98-02-02	7	14.95	49.72	.00	49.72	27.24	
98-02-09	7	14.85	49.37	.00	49.37	27.27	
98-02-16	8	14.85	49.37	.00	49.37	27.30	
98-02-24	6	14.85	49.37	.00	49.37	27.33	
98-03-02	7	14.85	49.37	.00	49.37	27.36	
98-03-09	7	14.75	49.01	.00	49.01	27.39	
98-03-16	8	14.70	48.84	.00	48.84	27.42	
98-03-24	6	14.65	48.66	.00	48.66	27.45	
98-03-30	7	14.90	49.54	.00	49.54	27.48	
98-04-06	8	14.85	49.37	.00	49.37	27.51	
98-04-14	6	14.85	49.37	.00	49.37	27.54	
98-04-20	7	14.65	48.66	.00	48.66	27.57	
98-04-27	7	14.85	49.37	.00	49.37	27.60	
98-05-04	6	14.65	48.66	.00	48.66	27.63	
98-05-10	8	16.10	53.77	.00	53.77	27.65	
98-05-18	7	14.75	49.01	.00	49.01	27.69	
98-05-25	7	14.90	49.54	.00	49.54	27.72	
98-06-01	7	14.65	48.66	.00	48.66	27.75	
98-06-08	7	14.70	48.84	.00	48.84	27.78	
98-06-15	7	14.85	49.37	.00	49.37	27.81	
98-06-22	8	14.90	49.54	.00	49.54	27.84	
98-06-30		14.85				27.87	

Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal- brýstingur bar	Meðal- Blenda kg/s	Meðal- Annað kg/s	Heildar- Heildar kg/s	Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
97-07-01	6	13.20	42.88	.00	42.88	25.82	
97-07-07	2	15.05	49.19	.00	49.19	25.84	
97-07-09	3	15.05	49.19	.33	49.52	25.85	
97-07-12	3	15.05	49.19	1.08	50.27	25.86	
97-07-15	6	14.75	48.16	.00	48.16	25.88	
97-07-21	7	14.60	47.64	.00	47.64	25.90	
97-07-28	8	14.75	48.16	.00	48.16	25.93	
97-08-05	6	15.10	49.36	.00	49.36	25.96	
97-08-11	8	14.90	48.67	.00	48.67	25.99	
97-08-19	1	14.80	48.33	.00	48.33	26.02	
97-08-20	5	14.80	38.66	1.20	39.86	26.03	Stóra stoppið
97-08-25	7	14.80	48.33	.00	48.33	26.04	
97-09-01	8	14.90	48.67	.00	48.67	26.07	
97-09-09	6	14.85	48.50	.00	48.50	26.11	
97-09-15	7	15.20	49.70	.00	49.70	26.13	
97-09-22	7	14.80	48.33	.00	48.33	26.16	
97-09-29	7	14.90	48.67	.00	48.67	26.19	
97-10-06	7	14.95	48.84	.00	48.84	26.22	
97-10-13	7	15.00	49.01	.00	49.01	26.25	
97-10-20	7	14.85	48.50	.00	48.50	26.28	
97-10-27	7	14.85	48.50	.00	48.50	26.31	
97-11-03	7	14.90	48.67	.00	48.67	26.34	
97-11-10	7	14.90	48.67	.00	48.67	26.37	
97-11-17	6	14.80	48.33	.00	48.33	26.40	
97-11-23	1	14.80	44.30	.50	44.80	26.42	Diskur fór
97-11-24	7	14.90	48.67	.00	48.67	26.43	
97-12-01	8	14.85	48.50	.00	48.50	26.46	
97-12-09	6	15.10	49.36	.00	49.36	26.49	
97-12-15	7	14.80	48.33	.00	48.33	26.52	
97-12-22	7	14.95	48.84	.00	48.84	26.54	
97-12-29	7	15.10	49.36	.00	49.36	26.57	
98-01-05	5	15.10	49.36	.00	49.36	26.60	
98-01-10	2	14.85	48.50	4.75	53.25	26.63	Hjárás opnuð.
98-01-12	7	14.85	48.50	6.00	54.50	26.63	
98-01-19	1	14.85	48.50	6.00	54.50	26.67	
98-01-20	6	15.00	49.01	.67	49.68	26.67	Hjárás lokað.
98-01-26	2	14.85	48.50	.00	48.50	26.70	
98-01-28	5	15.05	45.09	.50	45.59	26.71	Viðgerðir.
98-02-02	7	15.05	49.19	.00	49.19	26.73	
98-02-09	7	14.85	48.50	.00	48.50	26.76	
98-02-16	8	14.80	48.33	.00	48.33	26.79	
98-02-24	6	15.15	49.53	.00	49.53	26.82	
98-03-02	7	14.85	48.50	.00	48.50	26.84	
98-03-09	7	14.85	48.50	.00	48.50	26.87	
98-03-16	8	14.90	48.67	.00	48.67	26.90	
98-03-24	6	15.00	49.01	.00	49.01	26.94	
98-03-30	7	15.10	49.36	.00	49.36	26.96	
98-04-06	8	14.85	48.50	.00	48.50	26.99	
98-04-14	6	15.10	49.36	.00	49.36	27.03	
98-04-20	7	14.80	48.33	.00	48.33	27.05	
98-04-27	7	14.90	48.67	.00	48.67	27.08	
98-05-04	6	14.80	48.33	.00	48.33	27.11	
98-05-10	8	14.85	48.50	.00	48.50	27.13	
98-05-18	7	14.85	48.50	.00	48.50	27.17	
98-05-25	7	15.05	49.19	.00	49.19	27.20	
98-06-01	7	14.85	48.50	.00	48.50	27.23	
98-06-08	7	14.85	48.50	.00	48.50	27.26	
98-06-15	7	14.95	48.84	.00	48.84	27.29	
98-06-22	8	15.00	49.01	.00	49.01	27.32	
98-06-30		14.95				27.35	

Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal- þrýstingur bar	M e ð a l s t r e y m i Blenda kg/s	Annað kg/s	Heildar kg/s	Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
97-07-01	6	25.50	18.07	.00	18.07	7.72	
97-07-07	8	27.50	19.44	.00	19.44	7.73	
97-07-15	6	27.40	19.37	.00	19.37	7.74	
97-07-21	7	27.20	19.23	.00	19.23	7.75	
97-07-28	8	27.70	19.57	.00	19.57	7.76	
97-08-05	2	27.30	19.30	.00	19.30	7.78	
97-08-07	4	28.00	11.41	.00	11.41	7.78	Órengt að loka
97-08-11	7	28.00	11.41	.00	11.41	7.78	
97-08-18	1	26.60	29.56	.00	29.56	7.79	H101 opnað
97-08-19	1	26.60	29.56	.00	29.56	7.79	
97-08-20	5	26.90	19.51	.00	19.51	7.80	Minnkað við H102
97-08-25	7	26.90	19.51	.00	19.51	7.80	
97-09-01	4	27.00	19.58	.00	19.58	7.82	
97-09-05	4	26.10	23.99	.00	23.99	7.82	Aukið við H102
97-09-09	2	26.10	23.99	.00	23.99	7.83	
97-09-11	4	25.50	29.66	.00	29.66	7.84	Fullopið á H102
97-09-15	7	25.50	29.66	.00	29.66	7.85	
97-09-22	1	25.50	11.57	.00	11.57	7.86	H101 lokað
97-09-23	6	25.30	29.43	.00	29.43	7.86	H101 opnuð
97-09-29	7	25.30	29.43	.00	29.43	7.88	
97-10-06	7	25.40	29.55	.00	29.55	7.90	
97-10-13	7	25.40	29.55	.00	29.55	7.92	
97-10-20	7	25.50	29.66	.00	29.66	7.93	
97-10-27	7	25.20	29.32	.00	29.32	7.95	
97-11-03	7	25.20	29.32	.00	29.32	7.97	
97-11-10	7	25.30	29.43	.00	29.43	7.99	
97-11-17	6	25.00	29.10	.00	29.10	8.00	
97-11-23	1	25.00	29.10	.00	29.10	8.02	H102 úti 1 klst
97-11-24	7	25.20	29.32	.00	29.32	8.02	
97-12-01	8	25.10	29.21	.00	29.21	8.04	
97-12-09	6	25.50	29.66	.00	29.66	8.06	
97-12-15	7	25.10	29.21	.00	29.21	8.08	
97-12-22	7	25.40	29.55	.00	29.55	8.09	
97-12-29	7	25.20	29.32	.00	29.32	8.11	
98-01-05	7	25.50	29.66	.00	29.66	8.13	
98-01-12	7	25.50	29.66	.00	29.66	8.15	
98-01-19	7	25.40	29.55	.00	29.55	8.16	
98-01-26	7	25.50	29.66	.00	29.66	8.18	
98-02-02	7	25.40	29.55	.00	29.55	8.20	
98-02-09	7	25.40	29.55	.00	29.55	8.22	
98-02-16	7	25.40	29.55	.00	29.55	8.24	
98-02-23	1	25.40	17.24	.00	17.24	8.25	Breytt keyrsla.
98-02-24	6	25.40	29.55	.00	29.55	8.26	
98-03-02	7	25.40	29.55	.00	29.55	8.27	
98-03-09	7	25.00	29.10	.00	29.10	8.29	
98-03-16	8	25.20	29.32	.00	29.32	8.31	
98-03-24	6	25.10	29.21	.00	29.21	8.33	
98-03-30	7	25.30	29.43	.00	29.43	8.34	
98-04-06	8	25.40	29.55	.00	29.55	8.36	
98-04-14	6	25.20	29.32	.00	29.32	8.38	
98-04-20	7	25.20	29.32	.00	29.32	8.39	
98-04-27	7	25.20	27.93	.00	27.93	8.41	Keyrð með H-14
98-05-04	6	25.00	29.10	.00	29.10	8.43	
98-05-10	8	24.70	28.76	.00	28.76	8.44	
98-05-18	7	24.80	28.87	.00	28.87	8.46	
98-05-25	7	24.90	28.99	.00	28.99	8.48	
98-06-01	1	25.80	29.99	.00	29.99	8.50	
98-06-02	6	26.80	12.13	.00	12.13	8.50	H10/1 lokað.
98-06-08	7	26.80	12.13	.00	12.13	8.51	
98-06-15	7	27.30	12.35	.00	12.35	8.52	
98-06-22	8	27.30	12.35	.00	12.35	8.52	
98-06-30		27.30				8.53	

Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal-þrýstingur bar	Blenda kg/s	Meðalstreymi Annað kg/s	Heildar kg/s	Heildarvinnsla milljón tonn	Athugasemdir
97-07-01	6	15.65	54.29	.00	54.29	25.48	
97-07-07	2	15.90	55.21	.00	55.21	25.51	
97-07-09	3	15.90	55.21	.50	55.71	25.52	
97-07-12	3	15.90	55.21	1.08	56.29	25.53	
97-07-15	6	15.85	55.02	.00	55.02	25.55	
97-07-21	7	15.40	53.37	.00	53.37	25.58	
97-07-28	8	15.15	52.46	.00	52.46	25.61	
97-08-05	2	15.80	54.84	.00	54.84	25.65	
97-08-07	4	16.10	8.74	5.06	13.80	25.65	Hjárás eingöngu
97-08-11	3	16.10	.00	6.00	6.00	25.66	
97-08-14	5	16.10	.00	5.80	5.80	25.66	Körfumæling
97-08-19	1	13.65	.00	6.00	6.00	25.66	Hjárás eingöngu
97-08-20	1	13.65	.00	5.50	5.50	25.66	Stóra stoppið
97-08-21	4	13.65	.00	6.00	6.00	25.66	
97-08-25	7	14.30	.00	6.00	6.00	25.67	
97-09-01	4	17.15	.00	6.00	6.00	25.67	
97-09-05	4	15.65	46.94	.81	47.75	25.67	Opnað á blendu
97-09-09	6	15.65	54.29	.00	54.29	25.69	
97-09-15	4	15.80	54.84	.00	54.84	25.72	
97-09-19	3	15.80	52.56	.00	52.56	25.74	Diskur fór
97-09-22	7	15.85	55.02	.79	55.81	25.75	
97-09-29	7	15.75	54.66	.00	54.66	25.78	
97-10-06	7	16.15	56.13	.00	56.13	25.82	
97-10-13	7	15.90	55.21	.00	55.21	25.85	
97-10-20	7	15.80	54.84	.00	54.84	25.88	
97-10-27	7	15.20	52.64	.00	52.64	25.92	
97-11-03	7	15.60	54.11	.00	54.11	25.95	
97-11-10	7	15.70	54.47	.00	54.47	25.98	
97-11-17	7	15.45	53.55	.00	53.55	26.01	
97-11-24	7	15.35	53.19	.00	53.19	26.05	
97-12-01	8	15.45	53.55	.00	53.55	26.08	
97-12-09	6	15.70	54.47	.00	54.47	26.12	
97-12-15	7	15.15	52.46	.00	52.46	26.14	
97-12-22	7	15.40	53.37	.00	53.37	26.18	
97-12-29	7	15.55	53.92	.00	53.92	26.21	
98-01-05	7	15.60	54.11	.00	54.11	26.24	
98-01-12	7	15.35	53.19	.00	53.19	26.27	
98-01-19	7	15.40	53.37	.00	53.37	26.31	
98-01-26	7	15.45	53.55	.00	53.55	26.34	
98-02-02	7	15.40	53.37	.00	53.37	26.37	
98-02-09	7	15.25	52.82	.00	52.82	26.40	
98-02-16	7	15.30	53.01	.00	53.01	26.43	
98-02-23	1	15.45	53.55	3.50	57.05	26.47	Hjárás opnuð.
98-02-24	6	15.45	53.55	6.00	59.55	26.47	
98-03-02	7	15.45	53.55	6.00	59.55	26.50	
98-03-09	3	15.30	53.01	6.00	59.01	26.54	
98-03-12	4	15.35	53.19	.81	54.00	26.55	Hjárás lokað.
98-03-16	8	15.35	53.19	.00	53.19	26.57	
98-03-24	6	15.35	53.19	.00	53.19	26.61	
98-03-30	7	15.60	54.11	.00	54.11	26.64	
98-04-06	2	15.45	53.55	.00	53.55	26.67	
98-04-08	6	15.45	53.55	.33	53.89	26.68	Hjárás opn/lokað
98-04-14	6	15.45	53.55	.00	53.55	26.71	
98-04-20	7	15.55	53.92	.00	53.92	26.73	
98-04-27	7	15.40	53.37	.00	53.37	26.77	
98-05-04	6	15.80	54.84	.00	54.84	26.80	
98-05-10	8	15.35	53.19	.00	53.19	26.83	
98-05-18	7	15.60	54.11	.00	54.11	26.86	
98-05-25	7	15.50	53.74	.00	53.74	26.90	
98-06-01	7	15.25	52.82	.00	52.82	26.93	
98-06-08	7	15.40	53.37	.00	53.37	26.96	
98-06-15	7	15.50	53.74	.00	53.74	26.99	
98-06-22	8	15.50	53.74	.00	53.74	27.03	
98-06-30		15.45				27.06	



Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal- þrýstingur bar	Meðal- Blenda kg/s	Meðal- Annað kg/s	Heildar- Heildar kg/s	Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
97-07-01	6	11.20	.00	6.00	6.00	10.25	
97-07-07	8	12.90	.00	6.00	6.00	10.26	
97-07-15	6	12.90	.00	6.00	6.00	10.26	
97-07-21	7	12.90	.00	6.00	6.00	10.26	
97-07-28	8	13.20	33.67	.41	34.08	10.27	Opnað á blendu
97-08-05	6	13.20	36.12	.00	36.12	10.29	
97-08-11	8	13.40	36.71	.00	36.71	10.31	
97-08-19	6	13.05	35.68	.00	35.68	10.33	
97-08-25	7	13.05	35.68	.00	35.68	10.35	
97-09-01	8	12.95	35.38	.00	35.38	10.37	
97-09-09	6	12.90	35.24	.00	35.24	10.40	
97-09-15	7	13.20	36.12	.00	36.12	10.42	
97-09-22	7	13.45	32.25	.75	33.00	10.44	OV1 v/rakaskilju
97-09-29	7	13.00	35.53	.00	35.53	10.46	
97-10-06	7	13.35	36.56	.00	36.56	10.48	
97-10-13	7	13.40	36.71	.00	36.71	10.50	
97-10-20	7	13.10	35.82	.00	35.82	10.52	
97-10-27	7	12.90	35.24	.00	35.24	10.55	
97-11-03	7	13.10	35.82	.00	35.82	10.57	
97-11-10	7	13.30	36.41	.00	36.41	10.59	
97-11-17	7	12.95	35.38	.00	35.38	10.61	
97-11-24	7	12.90	35.24	.00	35.24	10.63	
97-12-01	8	12.95	35.38	.00	35.38	10.65	
97-12-09	6	13.30	36.41	.00	36.41	10.68	
97-12-15	7	13.25	36.27	.00	36.27	10.70	
97-12-22	7	13.05	35.68	.00	35.68	10.72	
97-12-29	7	13.10	35.82	.00	35.82	10.74	
98-01-05	7	13.35	36.56	.00	36.56	10.76	
98-01-12	7	12.95	35.38	.00	35.38	10.78	
98-01-19	7	13.15	35.97	.00	35.97	10.81	
98-01-26	7	13.30	36.41	.00	36.41	10.83	
98-02-02	7	13.35	36.56	.00	36.56	10.85	
98-02-09	7	13.10	35.82	.00	35.82	10.87	
98-02-16	7	13.15	35.97	.00	35.97	10.89	
98-02-23	1	13.40	26.00	1.75	27.75	10.91	Breyting.
98-02-24	6	13.40	36.71	.00	36.71	10.92	
98-03-02	7	13.40	36.71	.00	36.71	10.94	
98-03-09	7	12.85	35.09	.00	35.09	10.96	
98-03-16	8	13.20	36.12	.00	36.12	10.98	
98-03-24	6	12.95	35.38	.00	35.38	11.00	
98-03-30	7	13.15	35.97	.00	35.97	11.02	
98-04-06	8	13.35	36.56	.00	36.56	11.04	
98-04-14	6	13.00	35.53	.00	35.53	11.07	
98-04-20	7	13.20	36.12	.00	36.12	11.09	
98-04-27	7	9.80	2.03	5.54	7.57	11.11	Tekin úr notkun.
98-05-04	6	9.80	.00	6.00	6.00	11.11	
98-05-10	8	9.80	.00	6.00	6.00	11.12	
98-05-18	7	9.80	.00	6.00	6.00	11.12	
98-05-25	7	9.80	.00	6.00	6.00	11.13	
98-06-01	7	9.80	.00	6.00	6.00	11.13	
98-06-08	7	9.80	.00	6.00	6.00	11.13	
98-06-15	7	9.80	.00	6.00	6.00	11.14	
98-06-22	8	9.80	.00	6.00	6.00	11.14	
98-06-30		9.80				11.14	

Dags	Tími milli mælinga dagar	Meðal- þrýstingur bar	Blenda kg/s	M e ð a l s t r e y m i Annað kg/s	Heildar kg/s	Heildar- vinnsla milljón tonn	Athugasemdir
97-07-01	6	24.80	.00	.00	.00	.31	
97-07-07	8	27.10	.00	.00	.00	.31	Gamli mælir
97-07-15	6	26.90	.00	.00	.00	.31	Leiðrétt mæling
97-07-21	7	27.00	.00	.00	.00	.31	
97-07-28	8	18.30	16.28	.00	16.28	.31	
97-08-05	6	20.30	14.90	.00	14.90	.32	
97-08-11	7	9.20	17.14	.00	17.14	.33	
97-08-18	1	25.80	26.27	.00	26.27	.34	H102 í notkun
97-08-19	6	25.80	.00	.00	.00	.34	
97-08-25	7	26.60	.00	.00	.00	.34	
97-09-01	8	26.90	.00	.00	.00	.34	
97-09-09	6	26.70	.00	.00	.00	.34	
97-09-15	7	26.80	.00	.00	.00	.34	
97-09-22	7	26.90	.00	.00	.00	.34	
97-09-29	7	26.40	.00	.00	.00	.34	
97-10-06	7	25.80	.00	.00	.00	.34	
97-10-13	7	16.70	.00	.00	.00	.34	
97-10-20	7	26.50	.00	.00	.00	.34	
97-10-27	7	26.40	.00	.00	.00	.34	
97-11-03	7	26.50	.00	.00	.00	.34	
97-11-10	7	26.60	.00	.00	.00	.34	
97-11-17	7	26.50	.00	.00	.00	.34	
97-11-24	7	26.40	.00	.00	.00	.34	
97-12-01	8	26.40	.00	.00	.00	.34	
97-12-09	6	26.80	.00	.00	.00	.34	
97-12-15	7	26.50	.00	.00	.00	.34	
97-12-22	7	26.50	.00	.00	.00	.34	
97-12-29	7	26.60	.00	.00	.00	.34	
98-01-05	7	26.70	.00	.00	.00	.34	Enn lokuð.
98-01-12	7	26.60	.00	.00	.00	.34	
98-01-19	7	26.60	.00	.00	.00	.34	
98-01-26	7	26.60	.00	.00	.00	.34	
98-02-02	7	26.60	.00	.00	.00	.34	
98-02-09	7	26.55	.00	.00	.00	.34	
98-02-16	8	26.60	.00	.00	.00	.34	
98-02-24	6	26.80	.00	.00	.00	.34	
98-03-02	7	26.80	.00	.00	.00	.34	
98-03-09	7	26.90	.00	.00	.00	.34	
98-03-16	8	27.10	.00	.00	.00	.34	
98-03-24	6	26.60	.00	.00	.00	.34	
98-03-30	7	26.70	.00	.00	.00	.34	
98-04-06	8	26.70	.00	.00	.00	.34	
98-04-14	6	26.80	.00	.00	.00	.34	
98-04-20	7	26.80	.00	.00	.00	.34	
98-04-27	7	26.70	9.60	.00	9.60	.34	Tekin inn á OV1.
98-05-04	6	23.80	9.69	.00	9.69	.35	Ný blenda.
98-05-10	8	20.00	8.82	.00	8.82	.35	
98-05-18	7	20.00	8.82	.00	8.82	.36	
98-05-25	7	20.00	8.82	.00	8.82	.37	
98-06-01	1	20.00	8.82	.00	8.82	.37	
98-06-02	6	26.50	4.81	.00	4.81	.37	OV1 stöðvað.
98-06-08	7	26.50	.00	.00	.00	.37	Holan lokuð.
98-06-15	7	27.10	11.80	.00	11.80	.37	
98-06-22	8	27.10	11.80	.00	11.80	.38	
98-06-30		27.20				.39	
