

ÞÓRISVATNSMIÐLUN

SÉRSTÖK FRUMAÆTLUN

VERKFRÆÐISTOFA
SIGURÐAR THORODDSEN SF.
ÁRMÚLA 4 . REYKJAVÍK

Reykjavík, maí 1969

ÞJÓRSÁR- OG HVÍTÁRVIRKJANIR.

Þ O R I S V A T N S M I Ð L U N

Sérstök frumáætlun.

Samanburður á stofnkostnaði við mismunandi fyrirkomulag miðlunarvirkja við Þórisvatn ásamt veitu úr Köldukvísl og lausleg athugun á stofnkostnaði við veitu úr Tungnaá í Þórisvatn. Samanburðaráætlanirnar eru gerðar að beiðni ORKUSTOFNUNAR.

Reykjavík, maí 1969

Reykjavík, 14.5. 1969

ORKUSTOFNUN
Laugavegi 118
REYKJAVÍK

Hér með sendum við yður samanburðaráætlanir um mismunandi tilhaganir við miðlun í Þórisvatni, sem gerðar hafa verið að beiðni yðar.

Tilgangur athugananna er að ákvarða hagkvæmasta fyrirkomulag á miðlun vegna fyrirhugaðra virkjana á vatnasviðum Tungnaár og Þjórsár. Verkefni okkar var að fjalla um hinn byggingarfræðilega hluta en að vatnafræðilegum athugunum og orkuáætlunum er unnið á stoðnun yðar.

Kostnaðaráætlanir, sem allar eru mjög lauslegar, eru miðaðar við verðlag í ársbyrjun 1965, en í viðauka (kafla 8) höfum við endurskoðað áætlun um eina tiltekna miðlun miðað við verðlag í byrjun þessa árs.

Heildarniðurstöður samanburðaráætlana er að finna í kafla 6, en þær eru, að við miðlunarþörf undir 400 Gl er veituleið I (skurðleið) hagkvæmust. Við miðlun 400-1700 Gl er veituleið II (mynzturáætlunarleið) hagkvæmust en við miðlunarþörf fyrir yfir 1700 Gl verður ódýrast að velja leið III (jarðgangaleið). Með samanburði þeim, sem gerður er, fást enn fremur upplýsingar um, hvernig velja á hæsta og lægsta vatnsborð í Þórisvatni við tiltekna miðlun, þannig að hagkvæmast verði.

Æskilegt er að geta aukið innrennsli í Þórisvatn enn frekar en verður með veitu úr Koldukvísl. Þess vegna er jafnframt áðurnefndum samanburði gerð mjög lausleg áætlun um að veita Tungnaá í Þórisvatn (kafli 7). Veita þessi mun e.t.v. auka innrennslið um 600 Gl/á eða upp í 2000 Gl/a samtals. Hér ríkir, þá mikil óvissa um rennslið og enn fremur eru ýmis jarðfræðileg atriði lítt könnuð.

Með kveðju,

1. INNGANGUR

Greinargerð þessi, sem fjallar um mismunandi tilhaganir á miðlun í Þórisvatni, er gerð að beiðni ORKUSTOFNUNAR. Borinn er saman stofnkostnaður við mismunandi fyrirkomulag og breytilega miðlunarstærð. Tilgangur athugananna er að ákvarða hagkvæmasta fyrirkomulsg á miðlun vegna fyrirhugaðra virkjana í Tungnaá og Þjórsá og þá ennfremur með sérstakri hliðsjón af miðlunarþörf í fyrstu áföngum þessara virkjana. Verkefni þetta verður þá hér aðeins leyst að hluta, þar sem greinargerðin fjallar fyrst og fremst um hina byggingarfræðilegu hlið. Að vatnafræðilegum athugunum og orkuáætlunum verður unnið á ORKUSTOFNUN og að þeim athugunum loknum verður fyrst hægt að ákvarða hagkvæmusstu tilhögun miðlunarvirkja.

I "Mynzturáætlun 1967" var gert ráð fyrir að miðla um 700 GI í Þórisvatni og jafnframt að veita Köldukvísl inn í vatnið. Samanburður var gerður á kostnaði við tvær stíflur, þ.e., í Köldukvísl og Þórisósi með veitugögnum á milli annars vegar og hins vegar einni stíflu neðar, sem stíflaði bæði vatnsföllin í einu lagi. Síðari leiðin var þá valin, en við endurskoðun á þessum kostnaðaráætlunum og þá með þeirri breytingu á fyrr nefndri tilhögun, að stíflað er nokkru hærra í Köldukvísl og vatninu veitt í Þórisós um skurð, hefur komið í ljós að sú tilhögun er hagkvæmari jafnvel þó ekki sé reiknað með hækjun á núverandi vatnsborði Þórisvatns (571 m y.s.). I eftirfarandi samanburðaráætlunum er því alltaf reiknað með tveimur stíflum.

Samanburður er gerður á þremur veituleiðum úr Þórisvatni í Tungnaá, (sjá teikn. 01.07.2.01). Veituleið I er skurður úr Þórisvatni vestan við Vatnsfellið, sem er sama leið og valin var af Harza Engineering Co í áætlunum um Búrfelisvirkjun frá 1963. Veituleið II er veita úr Þórisvatni austan við Vatnsfelli í Blautukvísl, sem rennur í Tungnaá ofan við

Tungnaárkrók. Veituleið þessi er í höfuðatriðum eins og sú leið, sem fyrirhuguð var í "Mynzturáætlun 1967". Á veituleiðinni verða jarðgöng og skurðir gegnum þrjár hæðir, en á milli verða lægðir með uppistöðum. Loks eru gerðar áætlanir um þriðju leiðina, Veituleið III, sem eru jarðgöng úr vatninu niður í lægð suður af Vatnstellinu.

2. VEITA KALDAKVÍSL-ÞÓRISÓS OG MIÐLUNARSTÍFLUR

Eftirfarandi eru lauslegar kostnaðaráætlanir um veitu úr Köldukvísl í Þórisvatn. Gert er ráð fyrir að stífla Kölduvkísl við Sauðafell og Þórisós við Ösöldu. Vatni Köldukvíslar er veitt í Þórisós um opinn skurð (sjá teikn. 01.07.2.02).

lauslegar kostnaðaráætlanir hafa verið gerðar um veitu og miðlunarstíflur miðað við mismunandi stífluhæðir í Þórisósi (hæsta vatnsborð í Þórisvatni). Verðgrundvöllur áætlananna er hinn sami og í yfirlitsáætlunum mynturáætlana frá 1967, þ.e. miðaður við verðlag í ársbyrjun 1965. Magntölur fyrir stíflur eru teknar úr "Mynzturáætlun 1967", teikn. 01.07.1.35. Langsnið í stíflustæði og veituskurð eru sýnd á teikningu 01.07.2.03. Flutningsgeta skurðar við hæstu vatnstöðu í Þórisvatni er ákveðin um 80 kl/s.

Niðurstöður kostnaðaráætlananna eru í eftirfarandi skrá:

Vatnsborðshæð í Þórisv. m y.s.	Vatnsborðshæð í Köldukv. m y.s.	Stofnkostnaður				Alls Mkr.
		Stífla í Þórisósi Mkr.	Köldukv. Mkr.	Skurður Mkr.	Annað Mkr.	
571	577	12	40	38	40	131
573	577	20	40	38	40	138
575	577	30	40	38	40	148
577	579	41	54	33	40	168
579	580	58	64	39	40	201

3. VEITULEIÐ I.

Langsnið í veituleiðina er sýnt á teikningu 01.07.2.04.

Langsniðið sýnir jarðlinu og dýpi á fast. Jarðvegsdýpi er tekið eftir teikningu Harza No. 290P27, sem fylgir álitsgerð þeirra um Búrfellsvirkjun frá apríl 1965 (BURFELL PROJECT, Definite Project Report). Er þar byggt á könnun með borunum.

Lauslegar kostnaðaráætlanir eru gerðar um þrjár mismunandi skurðdýptir, þ.e. lægsta vatnsborð í Þórisvatni, 570, 565 og 560 m y.s., annars vegar miðað við flutningsgetu 80 kl/s við lægstu vatnsstöðu og hins vegar 115 kl/s.


Niðurstöður áætlana um heildarkostnað við miðlun með veitu úr Koldukvísl eru í eftirfarandi skrá.

Hv m y.s.	Lv m y.s.	Veita úr			Miðlunar-			Gl
		Koldukv. m stíflu í Þórisv. Mkr.	Veita úr Q=80 kl/s Mkr.	Þórisv. 0-115 kl/s Mkr.	kostn. alls Q=80 kl/s Mkr.	Q=115 kl/s Mkr.		
571	570	131	68	71	199	202	70	
"	565	131	93	100	224	231	400	
"	560	131	132	146	263	277	710	
573	570	138	68	71	206	209	210	
"	565	138	93	100	231	238	540	
"	560	138	132	146	270	284	850	
575	570	148	68	71	216	219	360	
"	565	148	93	100	241	248	690	
"	560	148	132	146	280	294	1000	
577	570	168	68	71	236	239	520	
"	565	168	93	100	261	268	850	
"	560	168	132	146	300	314	1160	
579	570	201	68	71	269	272	690	
"	565	201	93	100	294	301	1020	
"	560	201	132	146	333	347	1330	

Sjá enn fremur mynd 1 og 2.

MYND 1

Mkr. Miðlunar- og veitukostnaður. Veituleið I ($Q = 80 \text{ kl/s}$)

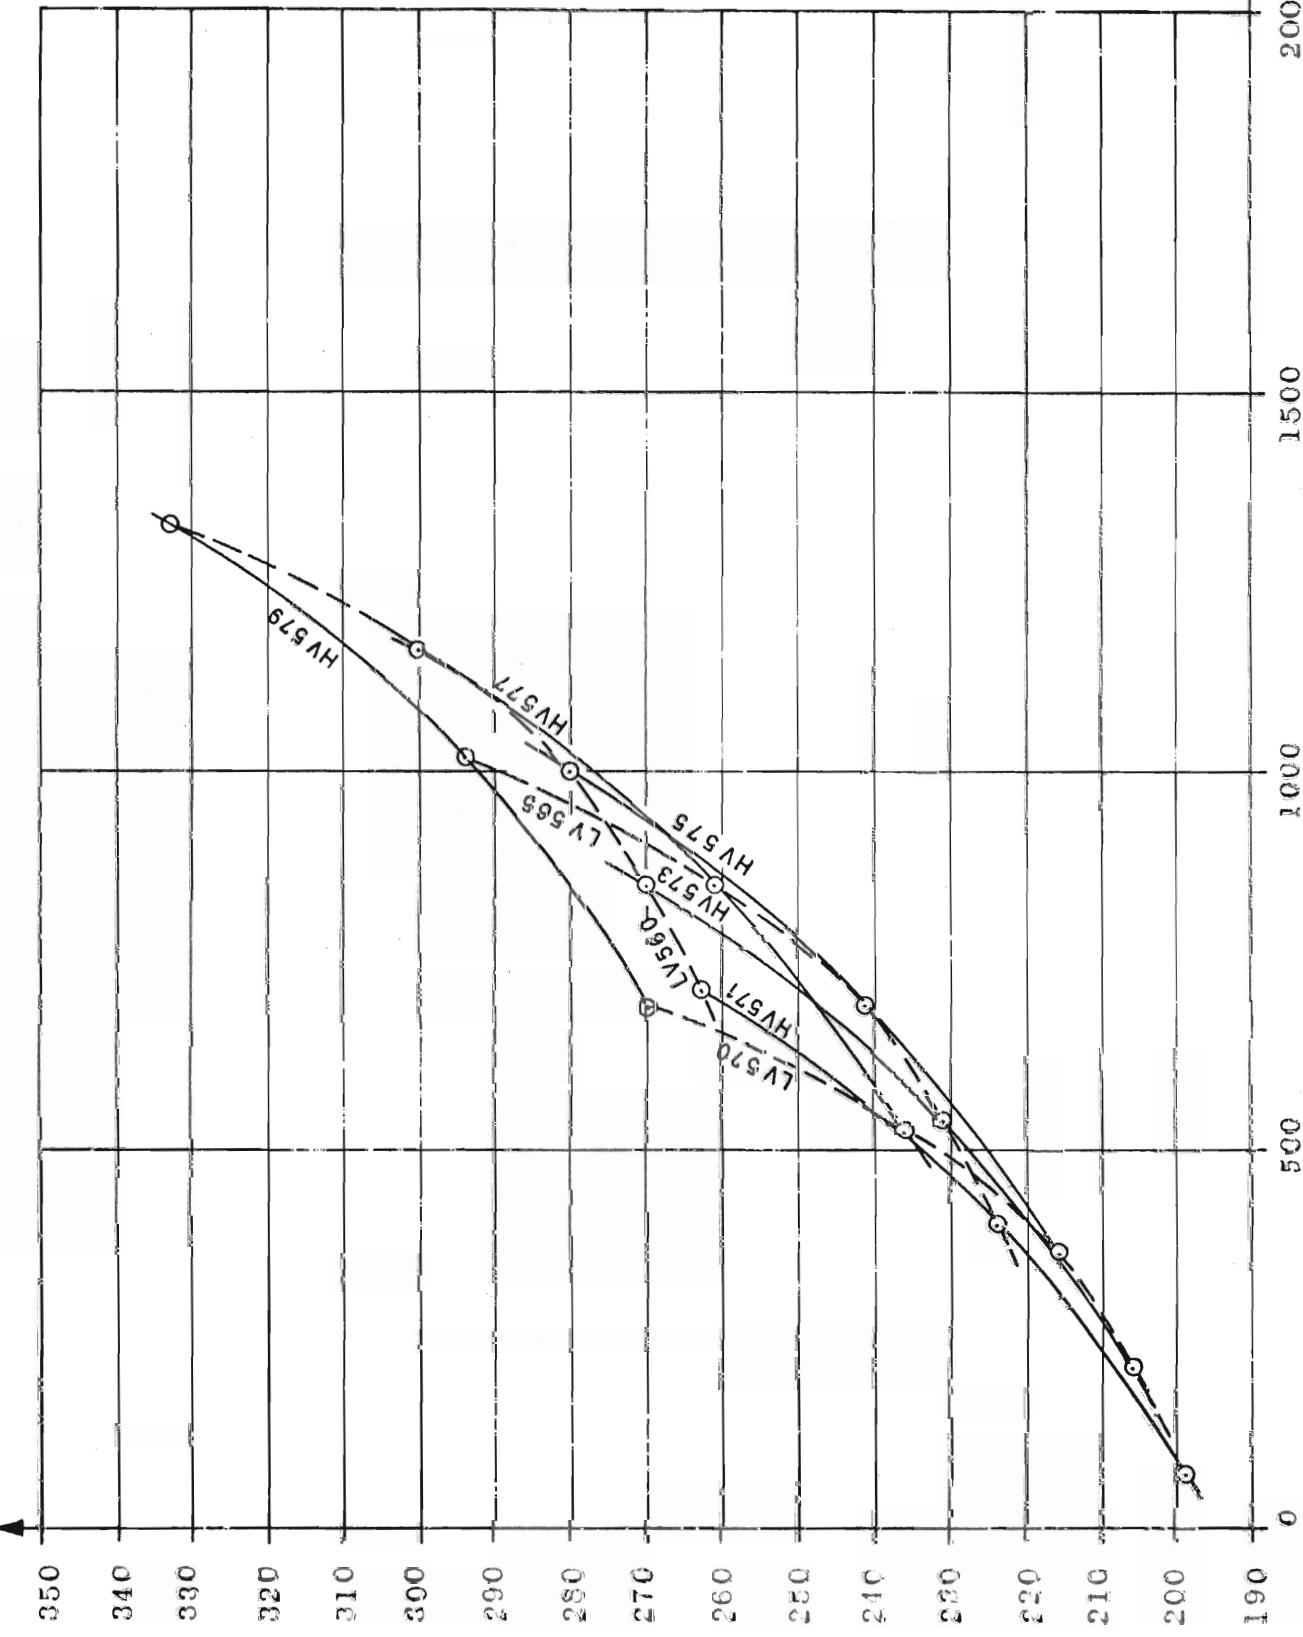

Kostnaðaráætlanir eru lauslegar og miðaðar við verölag f ársbyrjun 1965 (Mynztur-dætlunarverð)

Gert er ráð fyrir tveimur stíflum f Koldukvísl og þórisási með veitu-skurði á milli.

Flutningsgeta vatnsvega frá þórisvatni er um 80 kl/s við lægstu vatnss töðu.

→ Miðlun
20000 10000

1500


1000

500

0

MYND 2

MkF. ▲ Miðlinnar- og veitulosstnabur, Veituleið I ($Q = 115 \text{ kl/s}$)

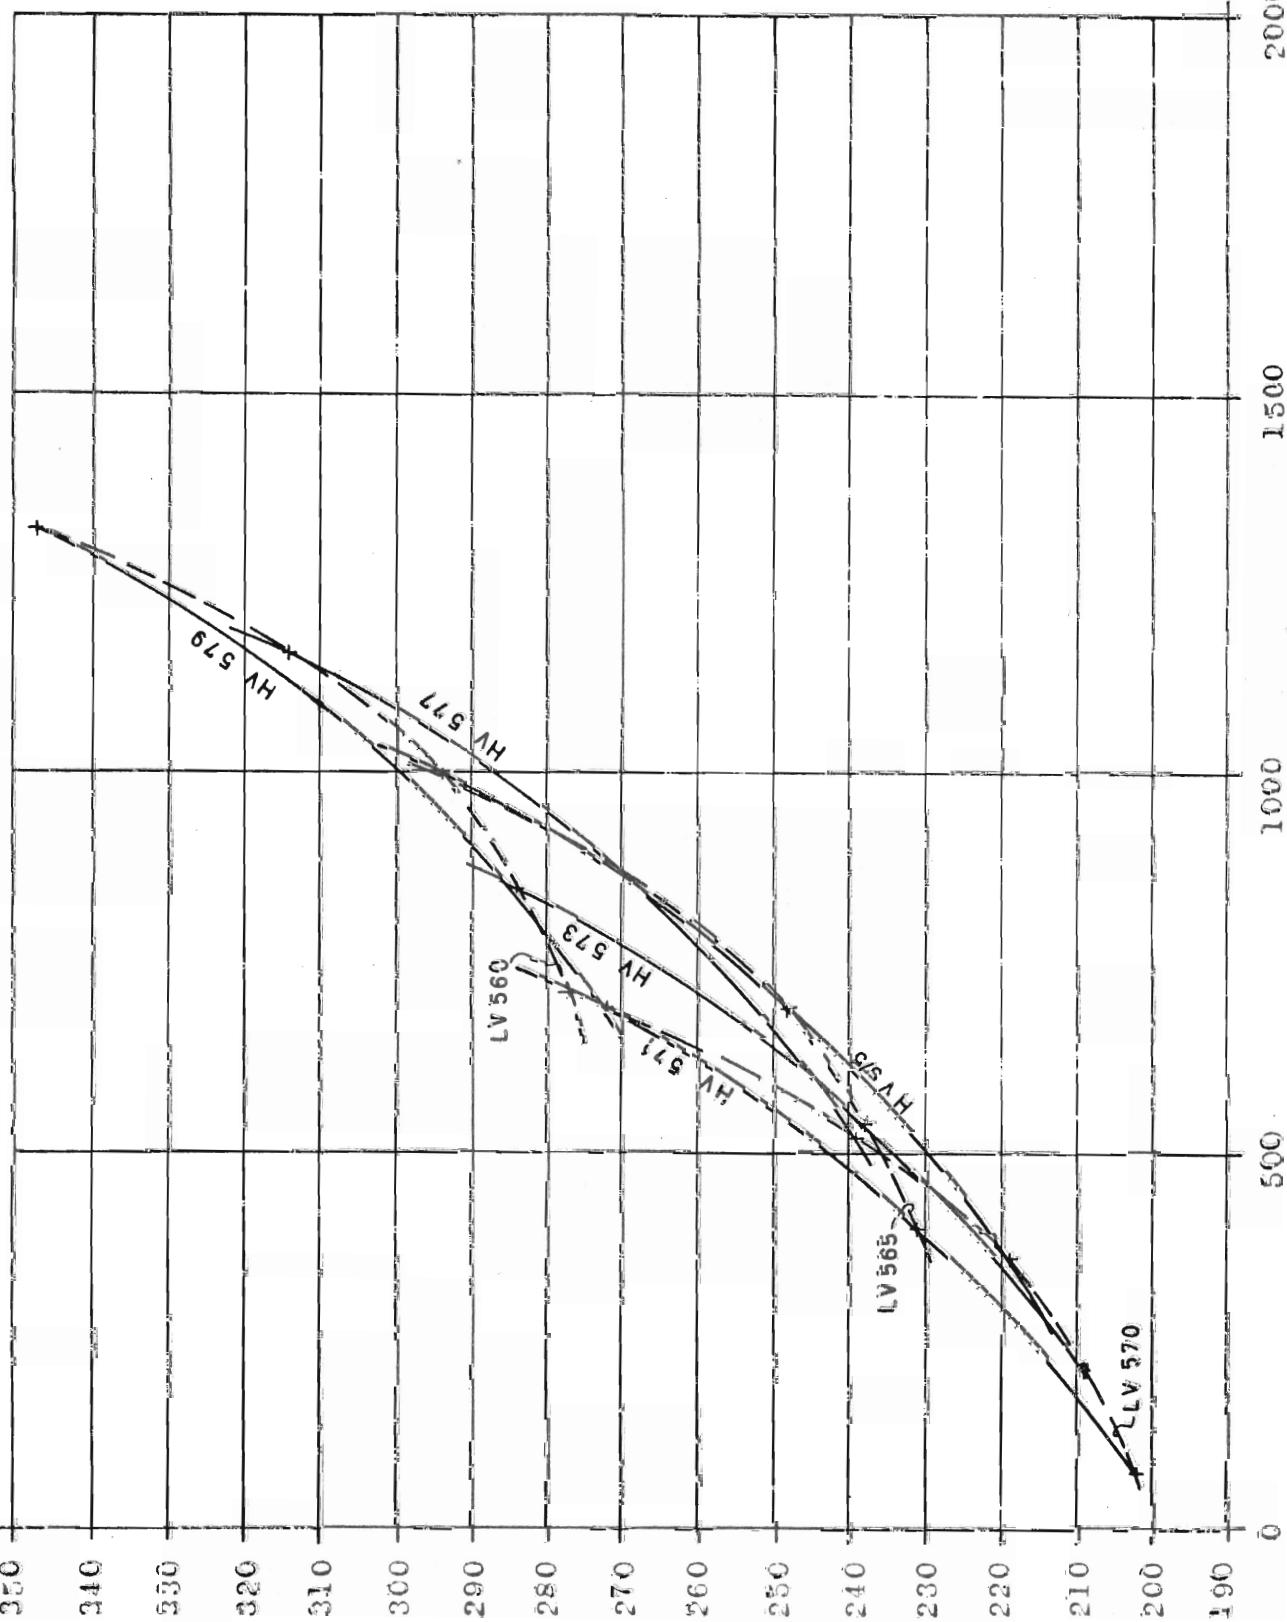

Kostnabaráðætlanir
eru lauslegar og
miðaðar við verð-
lag í ársþyrjun 1965
(Mynzturáðætlun-
arverð).

Gert er ráð fyrir
tveimur stíflum í
Köldukvísl og
þórisósi með veitu-
skurði á milli.

Flutningsgeta vatns-
vega frá þórisvatni
er um 115 kl/s við
lægstu vatnss töðu.

Midum

2000

1500

1000

500

0

4. VEITULEIÐ II

Langsnið í veituleiðina er sýnt á teikningu 01.07.2.04.


A langsníðinu er sýnt dýpi á fast, sem að mestu er byggt á ágizkun en að nokkru leyti á borunum, sbr. teikningu Orkustofnunar fnr. 8483.

Lauslegar kostnaðaráætlanir eru gerðar um mismunandi niðurdrátt í Þórisvatni, annars vegar miðað við flutningsgetu vatnsvega 80 kl/s og hins vegar 115, kl/s. Yfirlit yfir heildarkostnað við miðlun ásamt veitu úr Köldukvísl er eftirfarandi. Sjá ennfremur mynd 3 og 4.

Þórisvatn HV m y.s.	LV m y.s.	Veita úr Köldukv. m.stiflu í Þórisv. Mkr.		Veita úr Q-80 kl/s Mkr.	Þórisv. Q=115 kl/s Mkr.	Miðlunar- kostn. alls kl/s Mkr.		Miðlun Q=115 kl/s Mkr. Gl
571	570	131	79	85	210	216	70	
"	565	131	86	93	217	224	400	
"	560	131	95	104	226	235	710	
"	555	131	110	120	241	251	980	
"	550	131	131	143	262	274	1200	
573	570	138	79	85	217	223	210	
"	565	138	86	93	224	231	540	
"	560	138	95	104	233	242	850	
"	555	138	110	120	248	258	1120	
"	550	138	131	143	269	281	1340	
575	570	148	79	85	227	233	360	
"	565	148	86	93	234	241	690	
"	560	148	95	104	243	252	1000	
"	555	148	110	120	258	268	1270	
"	550	148	131	143	279	291	1490	
577	570	168	79	85	247	253	520	
"	565	168	86	93	254	261	850	
"	560	168	95	104	263	272	1160	
"	555	168	110	120	278	288	1430	
"	550	168	131	143	299	311	1650	
579	570	201	79	85	280	286	690	
"	565	201	86	93	287	294	1020	
"	560	201	95	104	296	305	1330	
"	555	201	110	120	311	321	1600	
"	550	201	131	143	332	344	1820	


MYND 3

Miðlunar- og veitukostnaður. Veituleið II ($Q = 80 \text{ kl/s}$).

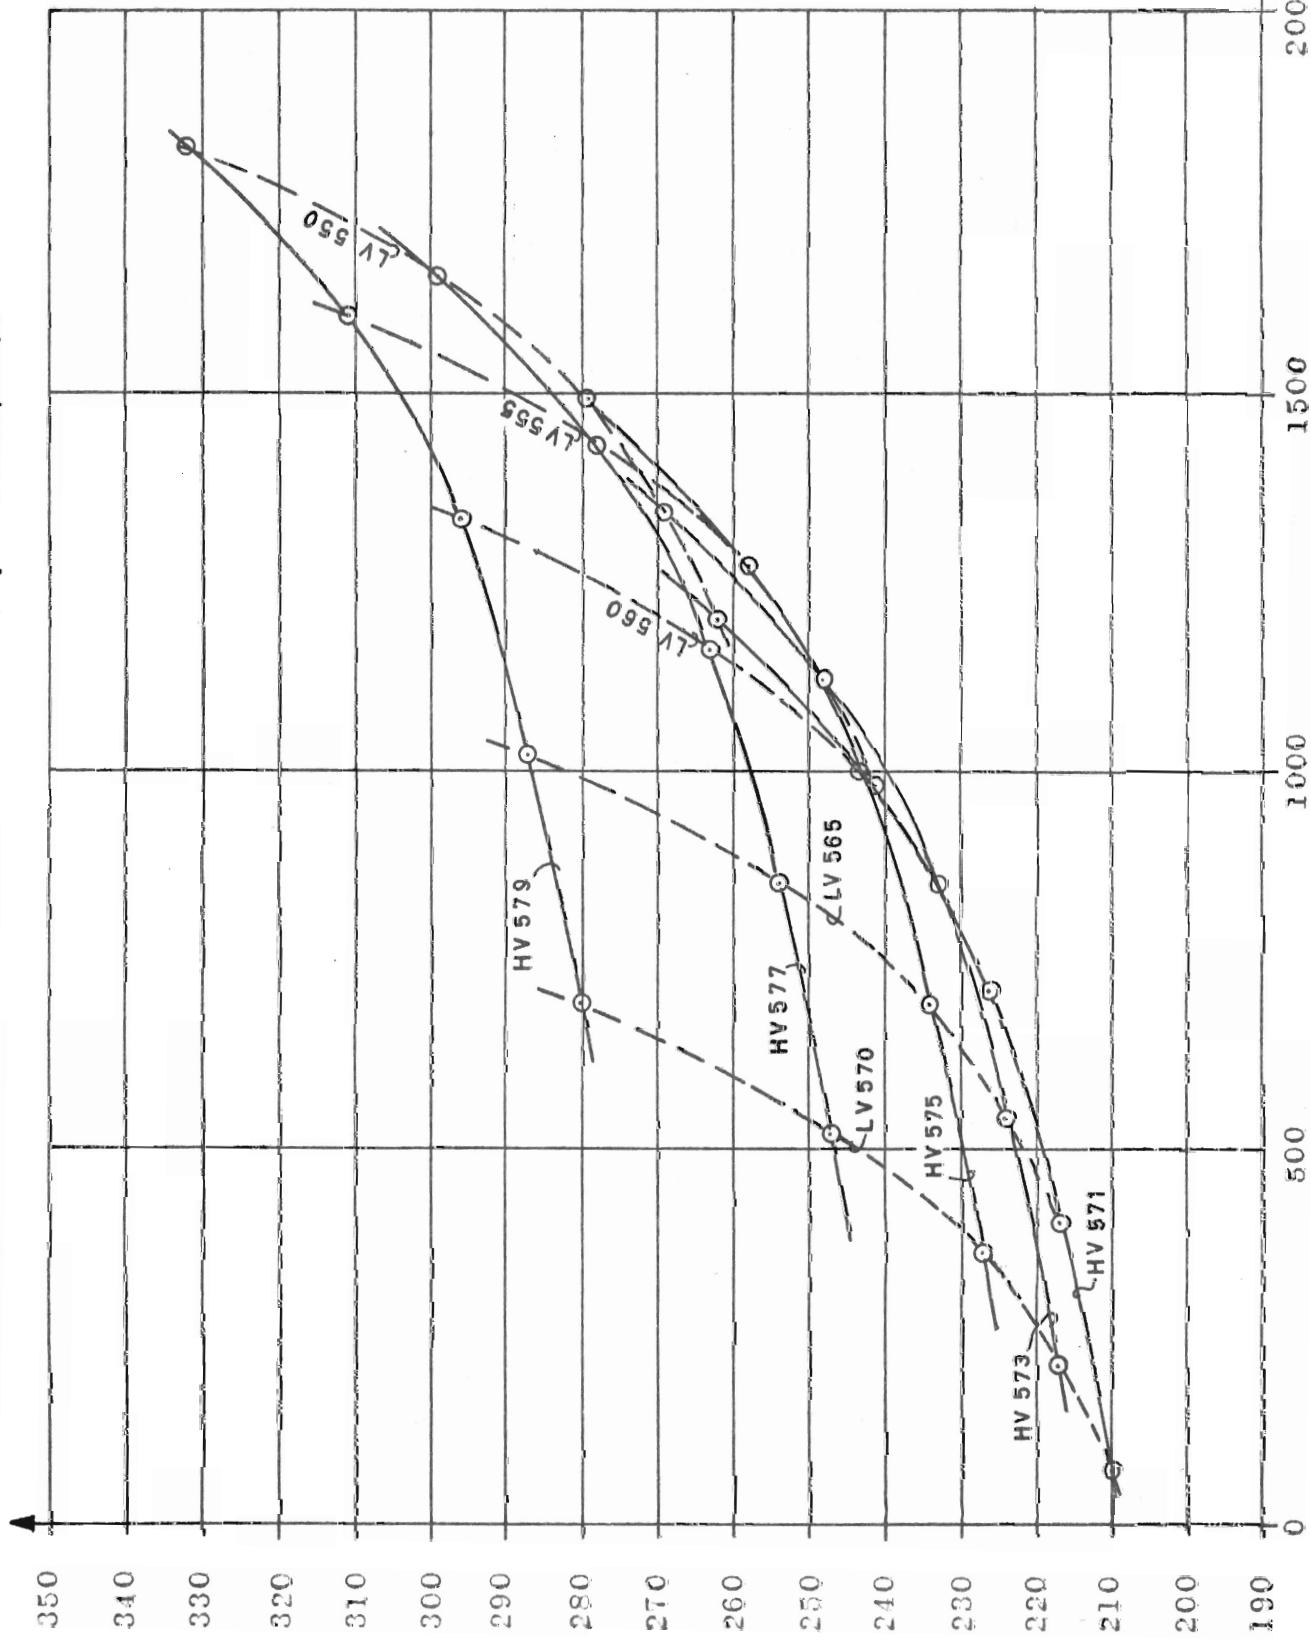

MYND 4

Miðlanar- og veitukostnaður, Veituleið II ($Q = 115 \text{ kl/s}$).

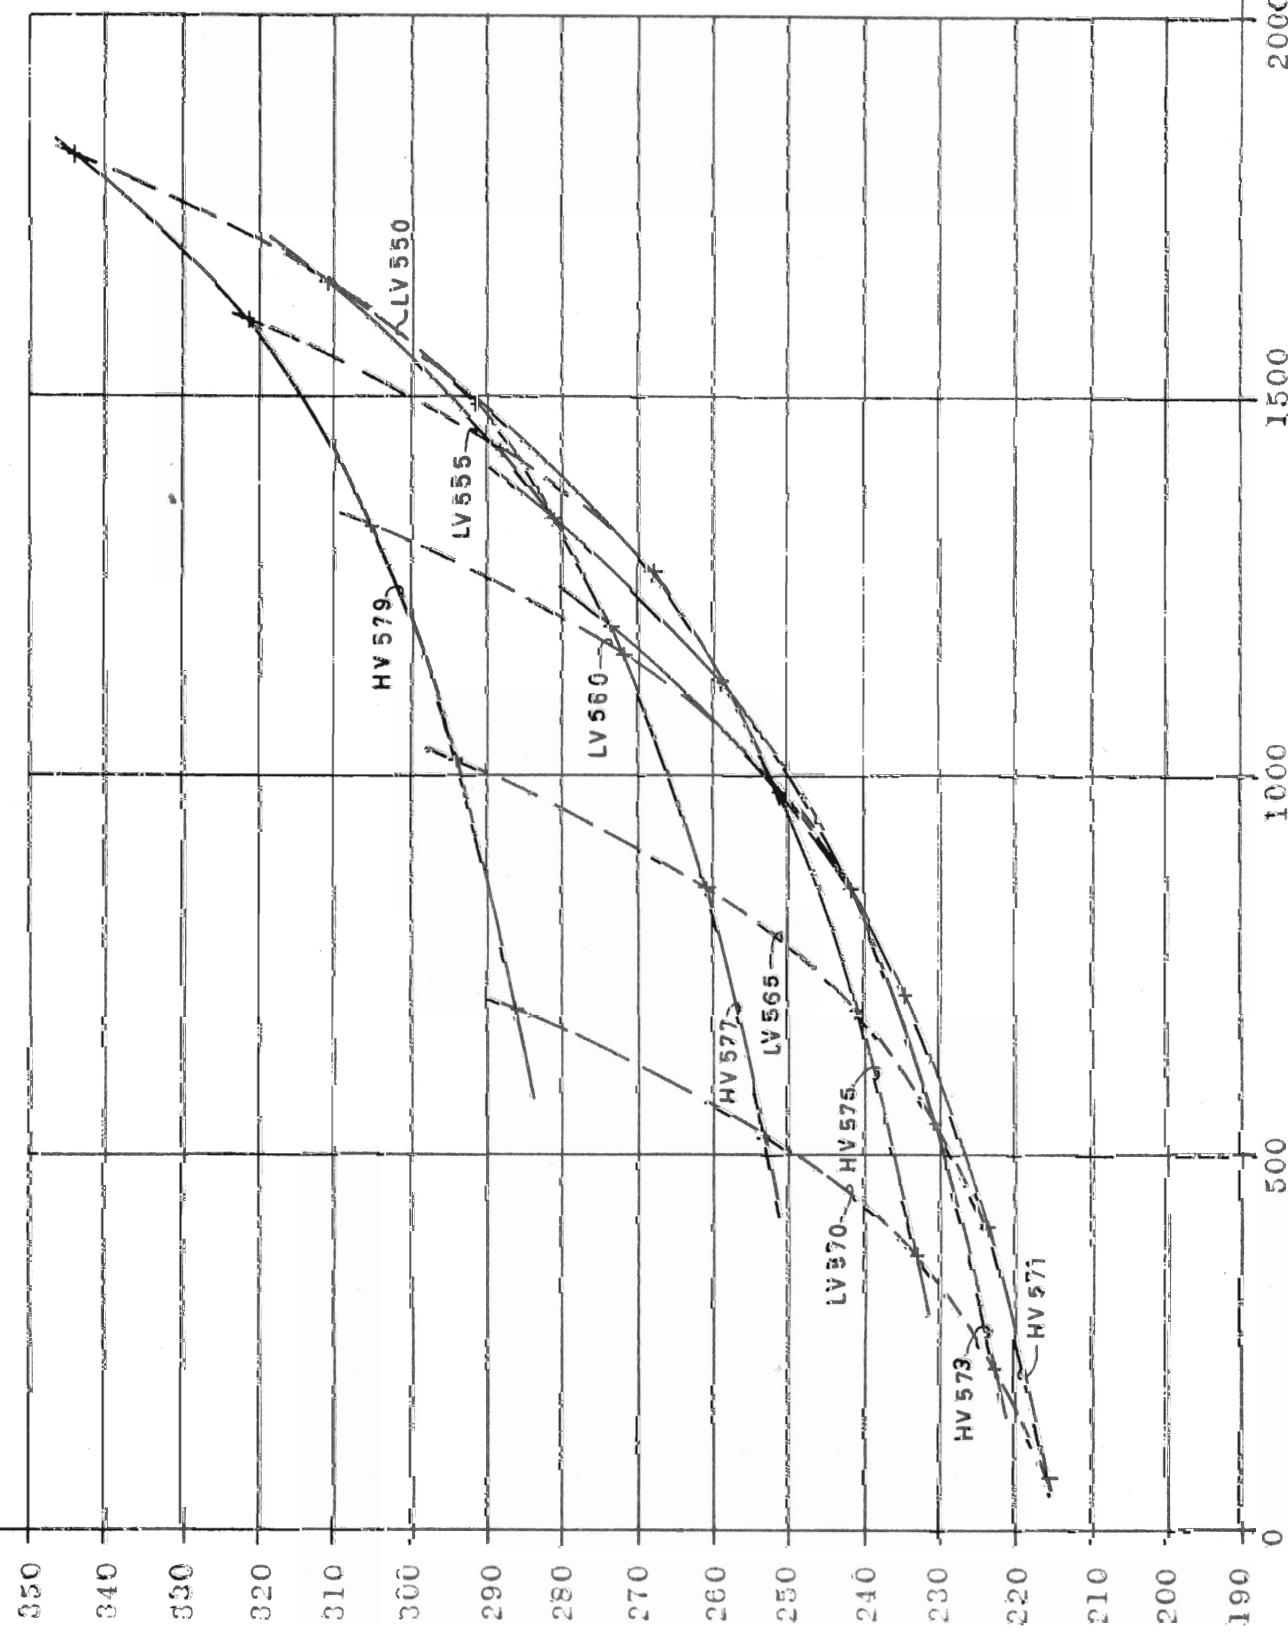

Kostnaðaráætlanið
eru lauslegar og
miðaðar við verð-
lag í ársbyrjun
1965 (Mynztur-
áætlunarverð).

Gert er ráð fyrir
tveimur stíflum í
Köldukvísl og
þórisósi með veitu-
skurði á milli
(sbr , áætlun Noreno).

Flutningsgeta
vatnsvega frá
þórisvatni er um
115 kl/s
við lægstu vatnssöðu.

Miðlun

G1

2000

1500

1000

500

0

Miðlun

G1

2000

1500

1000

500

0

5. VEITULEID III

Langsnið í veituleiðina er sýnt á teikningu 01.07.2.04. Dýpi á fastan jarðgrunn er sýnt með strikalínu og er þar um ágizkun að ræða.


I eftirfarandi skrá eru gerðar lauslegar áætlanir um kostnað við mismunandi miðlunarstærð.

Þórisvatn m.y.s.	HV	LV	Veita úr Köldukv. m.stíflu	Veita úr Q=80	Þórisv. kl/s	Miðlunar- kostn. alls kl/s	Miðlun kl/s	
			í Þórisv. Mkr.	Mkr.	Mkr.	Mkr.	Mkr.	Gl
571	560		131	142	155	273	286	710
"	550		131	151	166	282	297	1200
"	540		131	169	185	300	316	1580
"	535		131	193	212	324	343	1760
"	530		131	233	255	364	386	1930
573	560		138	142	155	280	293	850
"	550		138	151	166	289	304	1340
"	540		138	169	185	307	323	1720
"	535		138	193	212	331	350	1900
"	530		138	233	255	371	393	2070
575	560		148	142	155	290	303	1000
"	550		148	151	166	299	314	1490
"	540		148	169	185	317	333	1870
"	535		148	193	212	341	360	2050
"	530		148	233	255	381	403	2220
577	560		168	142	155	310	323	1160
"	550		168	151	166	319	334	1650
"	540		168	169	185	337	353	2030
"	535		168	193	212	361	380	2210
"	530		168	233	255	401	423	2380
579	560		201	142	155	343	356	1330
"	550		201	151	166	352	367	1820
"	540		201	169	185	370	386	2200
"	535		201	193	212	394	413	2380
"	530		201	233	255	434	456	2550


Sjá enn fremur mynd 5 og 6.

MYND 5

Miðlunar- og veitukostnadrur, Veituleið III ($Q = 80 \text{ kl/s}$).

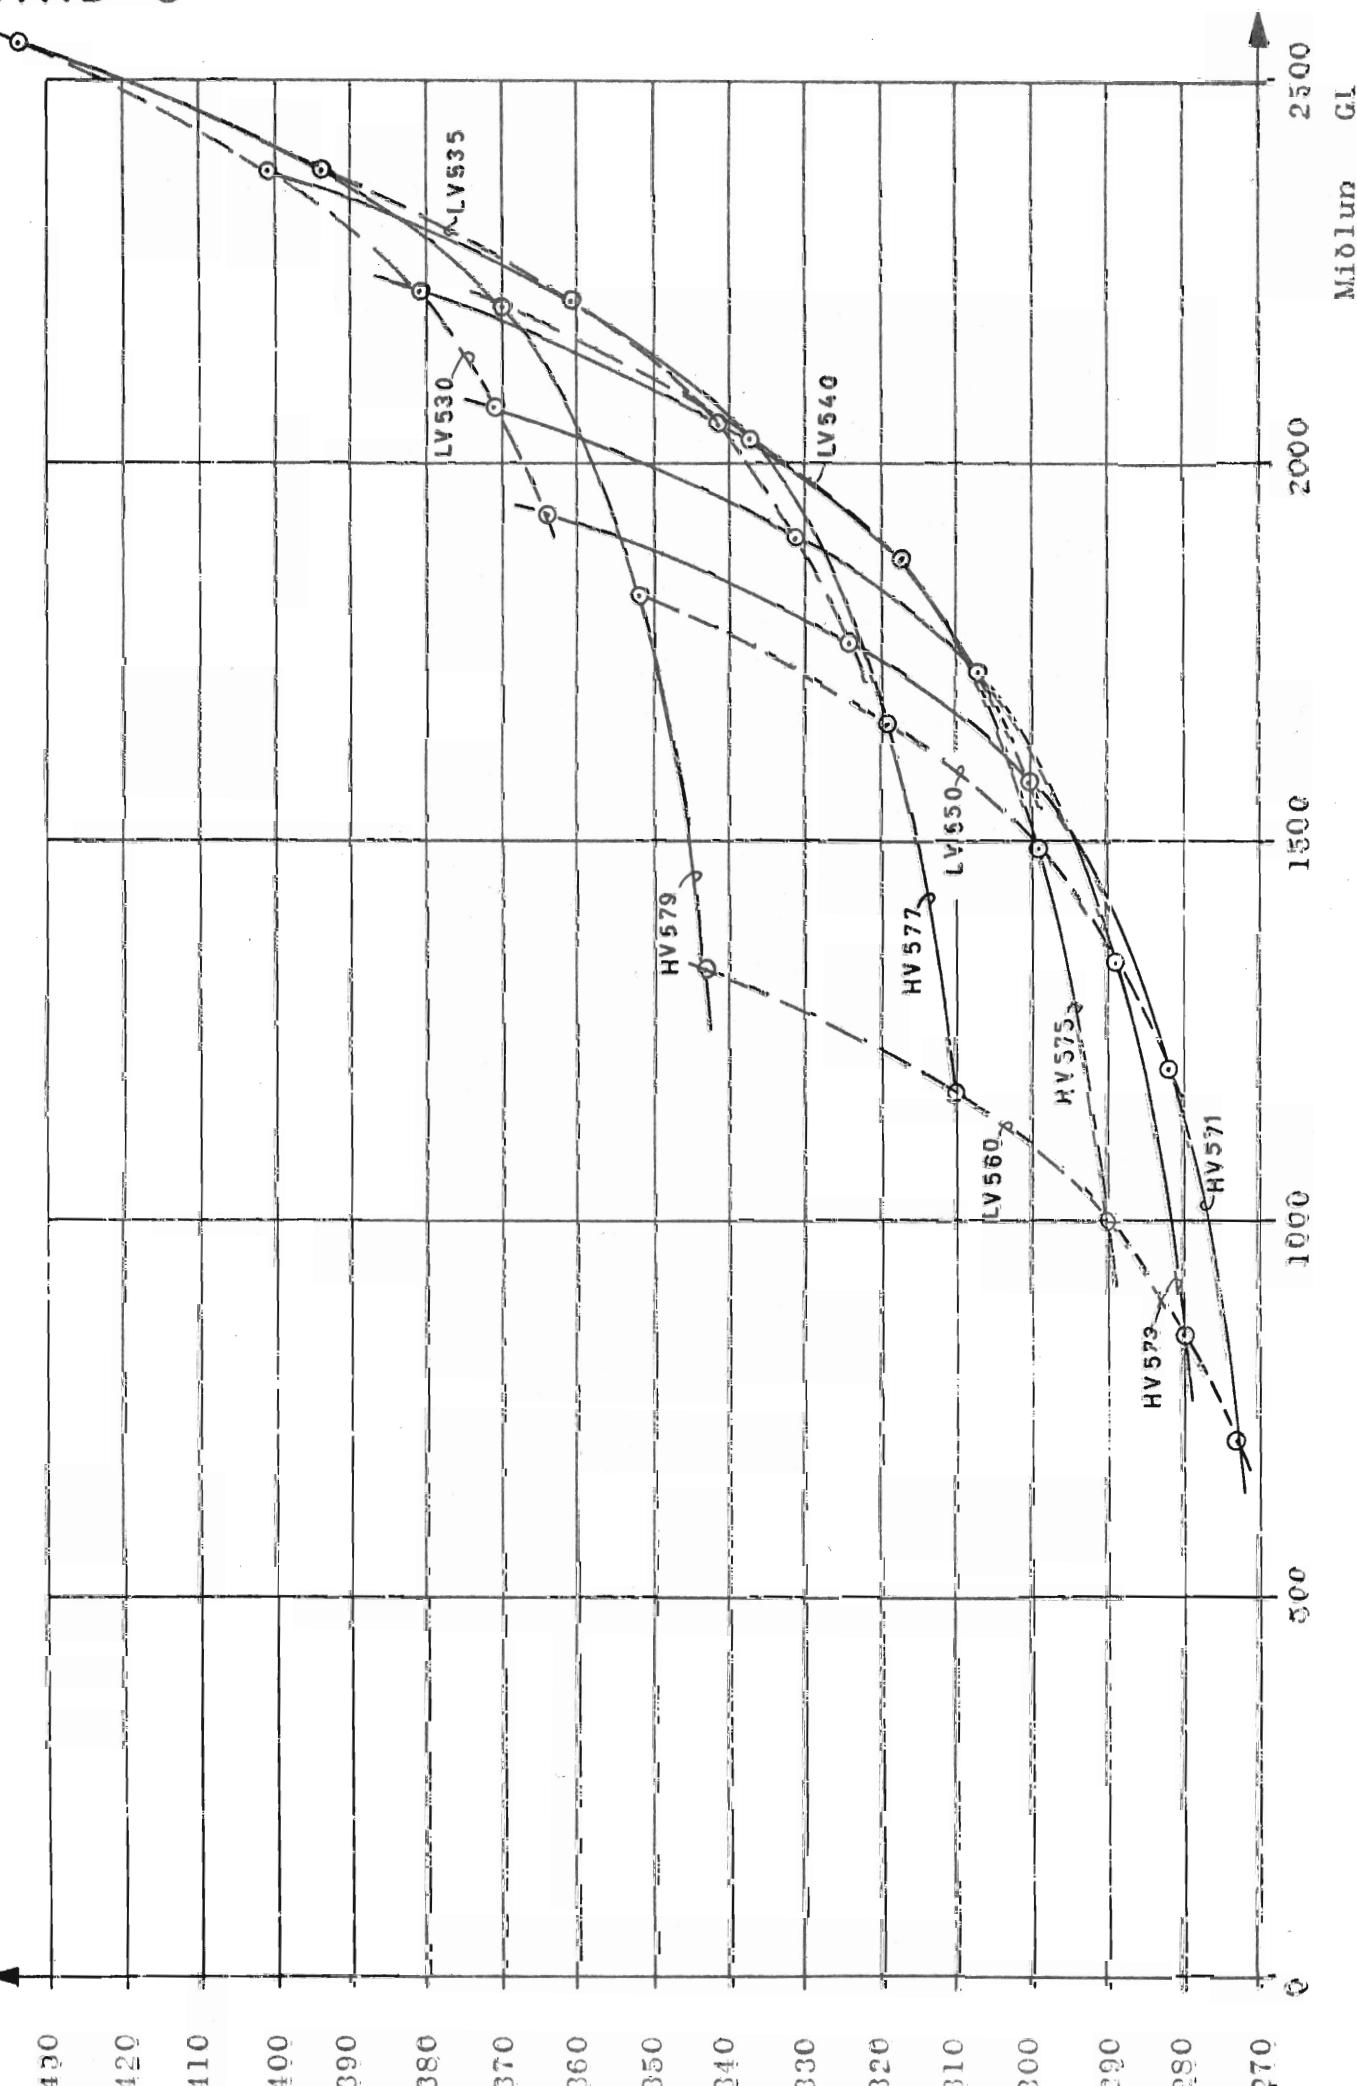

MYND 6

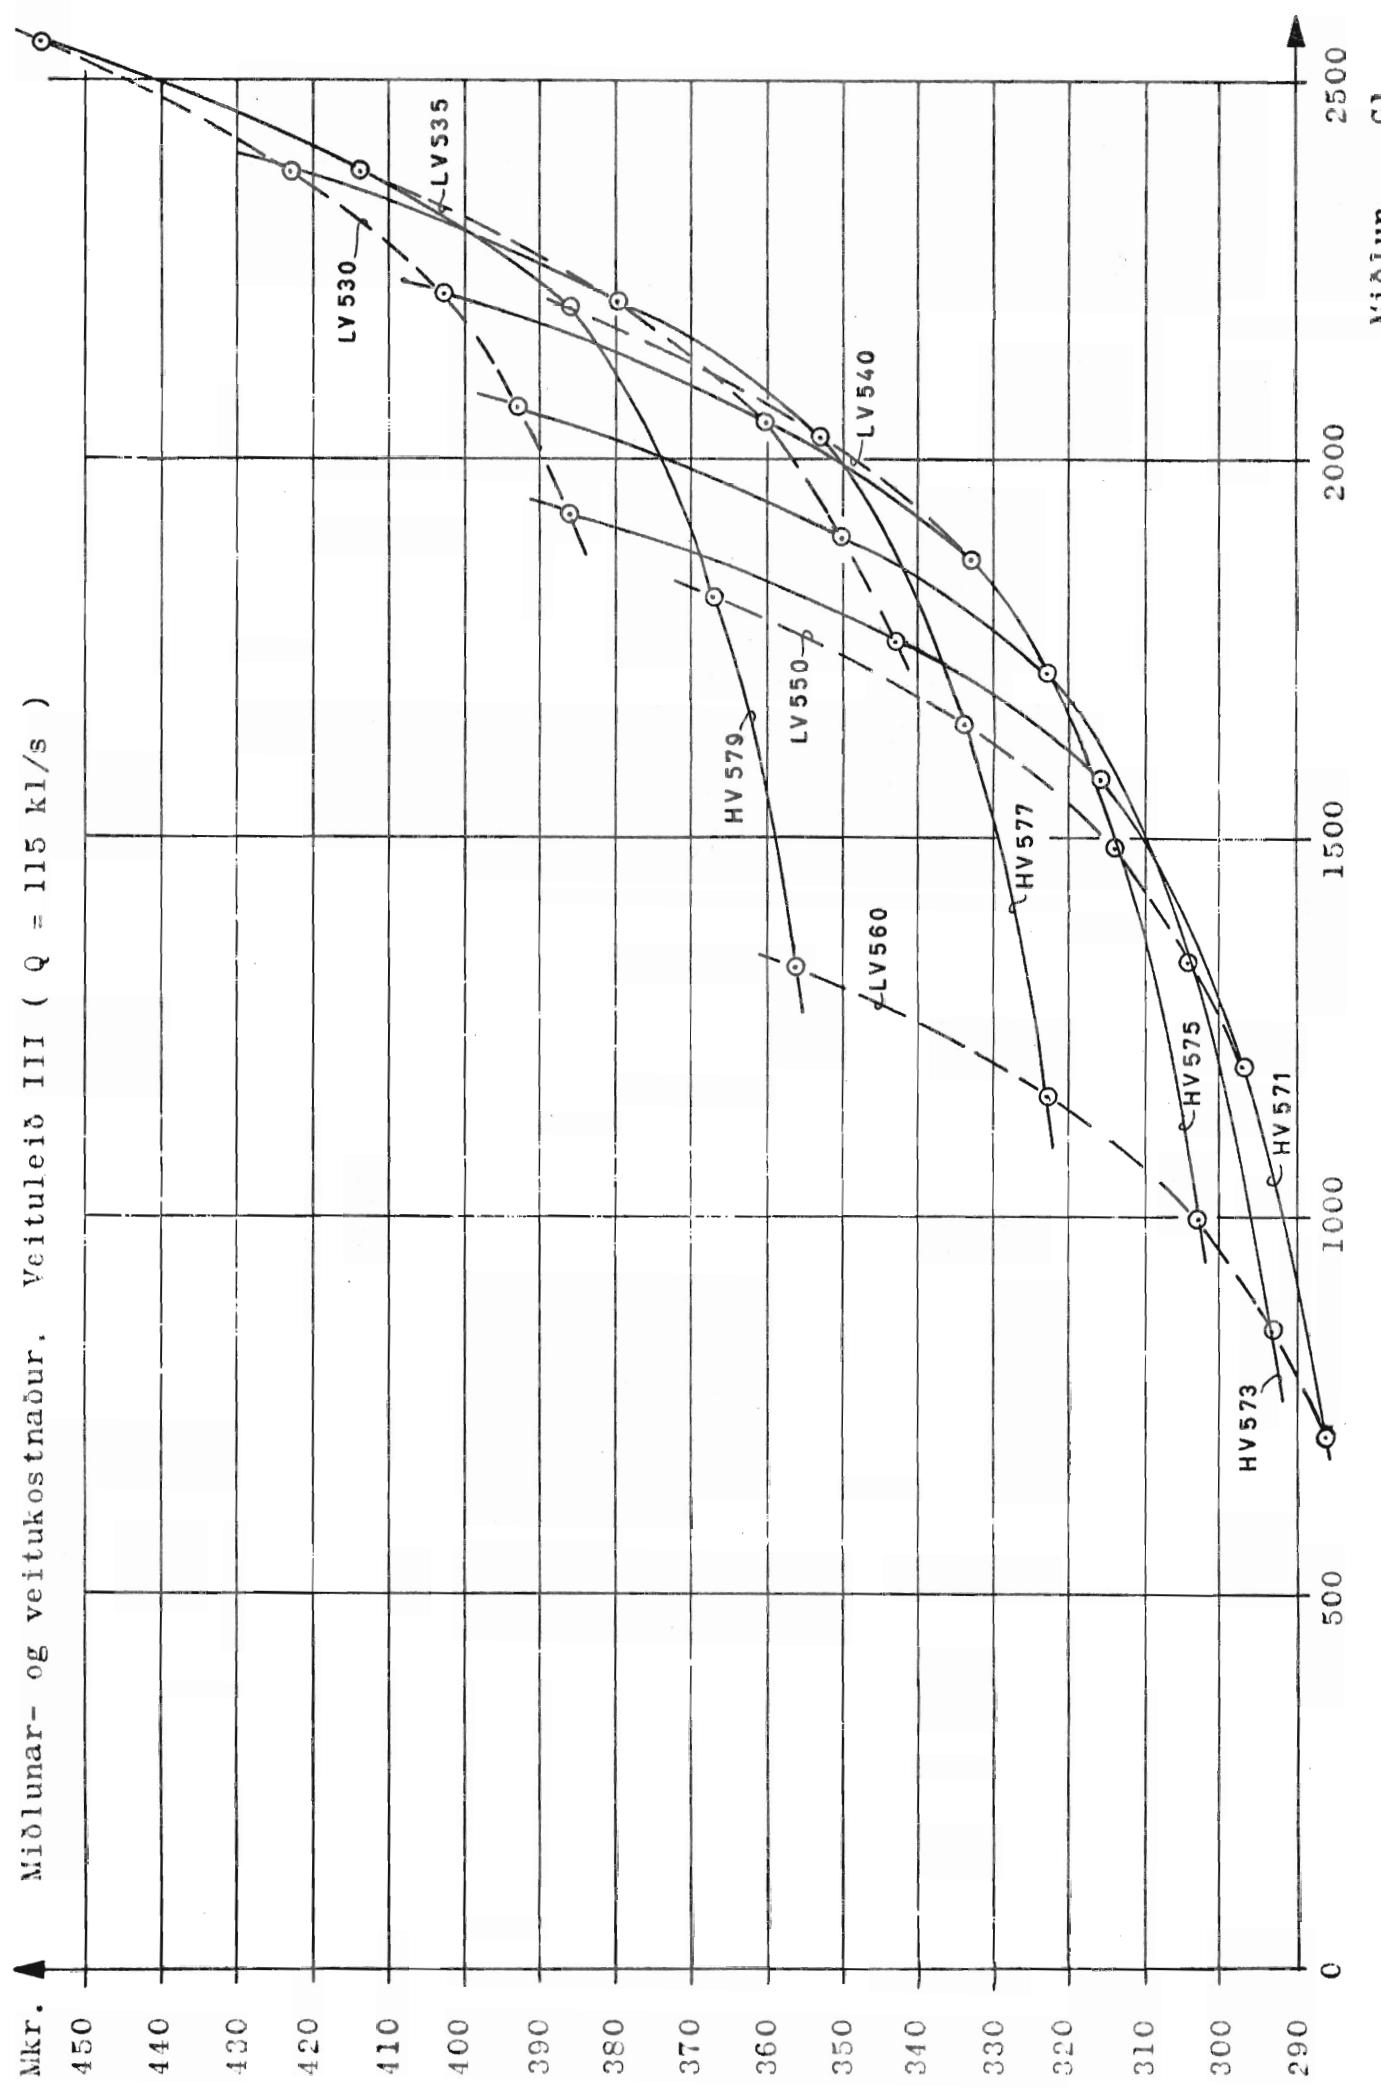

6. SAMANBURÐUR Á VEITULEIÐUM


Áætlanir um stofnkostnað miðlunarvirkja við Þórisvatn eru, eins og áður er tekið fram, gerðar til ákvörðunar á hagkvæmasta fyrirkomulagi. Yfirlit yfir niðurstöður áætlananna er að finna á mynd 7. Þar sést, að við miðlun undir um 400 Gl er hagkvæmast að velja veituleið I ("skurðleiðin"). Við miðlun 400-1700 Gl er veituleið II ("mynzturleið") hagkvæmust, en við miðlun yfir 1700 Gl verður ódýrast að velja leið III ("jarðgangaleið"). Hér verður þá að hafa í huga, að í áætlunum um stofnkostnað er ekki reiknað með miðlun í áföngum. Þannig myndi e.t.v. verða talið hagkvæmara að velja þá leið, sem í upphafi gefur lægstan stofnkostnað, þó að miðlunarvirkin yrðu dýrari við lokaðfanga.

Auk þess, að mynd 7 sýnir samanburð á kostnaði við hinum mismunandi veituleiðir, er þær að finna upplýsingar um hagkvæmast val á hæsta og lægsta vatnsborði í Þórisvatni við mismunandi miðlunarstærð. Sé t.d. miðað við um 700 Gl miðlun verður hagkvæmast að hækka núverandi vatnsborð um 1 m upp í hæð 571 m y.s. og lækka það um 10 m niður í 560 m hæð y.s., þegar veituleið II er valin, en tilsvarandi hæðir með veituleið I eru frá 565 í 575 m y.s.

Rétt er að minna enn á, að kostnaðaráætlanir eru miðaðar við verðlag í ársbyrjun 1965. Þær eru allar mjög lauslegar og því fyrst og fremst ætlaðar til samanburðar, en sem áætlanir um raunverulegan stofnkostnað ber að taka þær með varúð.

Stofnuskostnaður Mkr.

MYND 7

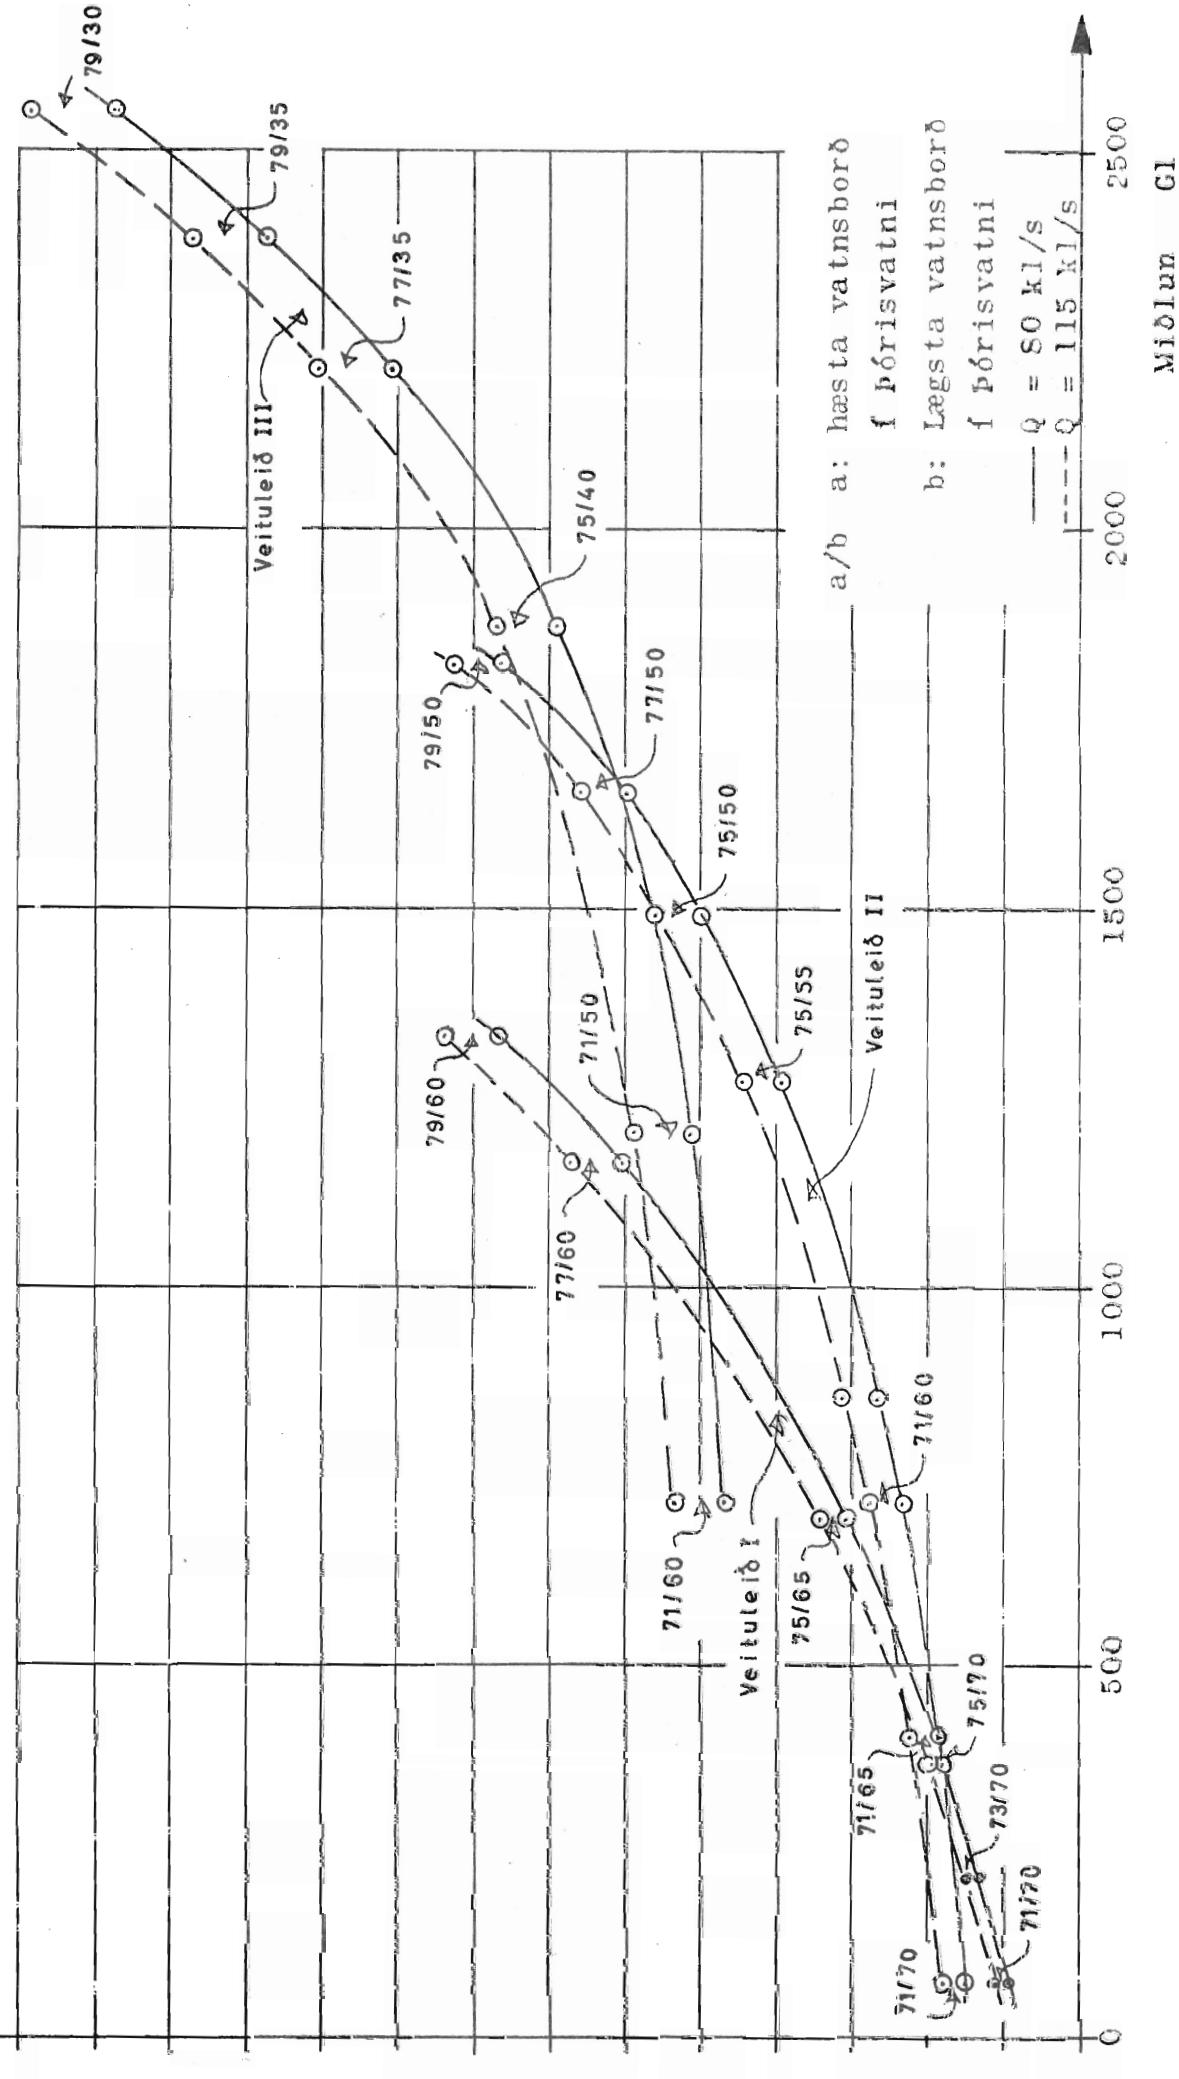

7. VEITA TUNGNAÁ-ÞÓRISVATN

Vegna stærðar (70 km^2), dýptar og annarra aðstæðna eru mjög hagstæð skilyrði til miðlunar í Þórisvatni. Hins vegar setur aðrennsli að vatninu eðlileg takmörk fyrir því hversu mikla miðlun hagkvæmt verður að nýta. Í samanburðaráætlunum hér að framan er reiknað með að veita Köldukvísl í Þórisvatn og er rennsli hennar ásamt rennsli Þórisóss um 1400 Gl/a, en tiltölulega auðvelt er að nýta allt að 2000 Gl miðlun í Þórisvatni. Það hlýtur því að vera æskilegt að geta aukið aðrennsli að vatninu, sé það unnt með hóflegum tilkostnaði.

Fyrstu hugmyndir um að veita Tungnaá í Þórisvatn voru að gera stíflu við Vatnaöldur og veita ánni í jarðgöngum og skurðum inn í vatnið. Jarðfræðilegar aðstæður gera þessa hugmynd vart framkvæmanlega og var því fljóttlega horfið frá henni.

Í álitsgerð Orkustofnunar frá september 1967, "STÓRISJÓR, Jarðfræði stíflustæðis á Tungnaá við Snjóöldufjallgarð", bendir Haukur S. Tómasson jarðfræðingur á nýja veituleið með stíflu í Tungnaá á móts við Svartakamb. Á teikningu 01.07.2.05 er yfirlit yfir veituleið, sem í meginatriðum er byggð á þessum hugmyndum. Tungnaá er stífluð á móts við Svartakamb og er vatni hennar veitt í skuðrum og með fyrirhleðslum um Hraundyr milli Vörðufells og Hamrafells í nokkuð stórt stöðuvatn, sem myndast mundi undir fjöllunum við suðurströnd Þórisvatns. Að lokum er um 600 m langur skurður um lægð í þessum fjöllum, sem tengir veituna við Þórisvatn. Veitan mundi að mestu leyti liggja um lek jarðlög í virku sprungu- og eldgosasvæði. Ýmsir jarðfræðilegir erfiðleikar geta því orðið við gerð veituvirkjanna en þetta hefur ekki verið kannað til neinnar hlítar.

Ekki er vitað um rennsli Tungnaár á fyrirhuguðu stíflustæði en þess hefur verið getið til, að það væri um 600 Gl/a. Á upprætti 01.07.2.05 er sýnt langsnið í veituleiðina.

Mjög lauslega áætlaður stofnkostnaður við öllu veituvirkini er um 190 Mkr.

8. VIÐAUKI

Hér á eftir er gerð sundurliðuð áætlun um 1000 Gl miðlun í Þórisvatni. Kostnaðaráætlanir, sem eru mjög lauslegar, eru nú miðaðar við verðlag í ársbyrjun 1969.

A mynd 7 (bls. 13) sést, að miðað við 1000 Gl miðlun, verður hagkvæmast að velja veituleið II ("Mynzturáætlunarleið") með hækjun á vatnsborði Þórisvatns upp í um 573 m hæð y.s. og lækkun niður í um 557,5 m y.s.

Samkvæmt eftirfarandi sundurliðun verður heildarkostnaður við þessi miðlunarvirki.

Stífla í Köldukvísl með veitu	141	Mkr.
Stífla í Þórisósi	66	"
Veita úr Þórisvatni í Blautukvísl	<u>163</u>	"
Alls:		<u>370</u> Mkr.

A mynd 7 sest að heildarkostnaður miðaður við verðlag í ársbyrjun 1965 hefur verið áætlaður um 240 Mkr. og er hækjun því um 58%, en allar eru þessar áætlanir lauslegar og ber því að taka kostnaðarniðurstöður með varúð.

Stífla í Koldukvísl (vbl 577 m y.s.) og veita í Þjórsá.


Innréttningar á vinnustað	10,0	Mkr.
Gröftur í stíflustæði	4,0	"
Fylling (220.000 m ³ á 130)	28,6	"
Steinsteypa ásamt mótum og bendingu (1600 m ³ á 4000)	6,4	"
Bergþéttинг o.fl.	10,0	"
Veituskurður (gröftur og sprenging 107.000 m ³ á 135)	14,4	"
Framhjárennslisgöng og vatnsvarnir	20,0	"
Vegir og raflinur (1/2 · 30 km)	<u>10,5</u>	"
	103,9	Mkr.
Umsjónarkostnaður, ófyrirséð og vextir (um 36%)	<u>37,1</u>	"
Samtals:	<u>141,0</u>	Mkr.

Stífla í Þórisósi, HV = 573 m y.s.

Innréttningar á vinnustað	7,0	Mkr.
Gröftur og lagfæringar á stíflustæði	4,0	"
Fylling (110.000 m ³ á 130)	14,3	"
Steinsteypa ásamt mótum og bendingu (800 m ³ á 4000)	3,2	"
Bergþéttинг o.fl.	6,0	"
Vatnsvarnir	3,5	"
Vegir og raflinur (1/2 · 30 km)	<u>10,5</u>	"
	48,5	Mkr.
Umsjónarkostnaður, ófyrirséð og vextir (um 36%)	<u>17,5</u>	"
Samtals:	<u>66,0</u>	Mkr.

Veita úr Þórisvatni. Veituleið II, LV 557,5 m y.s.
Q = 80 kl/s

Innréttigar á vinnustað	10,0	Mkr.
Föðruð göng (0,8 km á 58 Mkr)	46,4	"
Styrkingar í göngum o.fl.	10,0	"
Sprengingar í skurðum (100.000 m ³ á 150)	15,0	"
Gröftur í skuðrum (135.000 m ³ á 35)	4,7	"
Styrkingar o.fl. í skurðum	2,0	"
Steinsteypa ásamt mótum og bendingu (1000 m ³ á 4000)	4,0	"
Lokubúnaður og lokuhús	11,0	"
Bergþettingar	5,0	"
Vatnsvarnir o.fl.	5,0	"
Vegir og raflínur (10 km)	7,0	"
	120,1	Mkr.
Umsjónarkostnaður, ófyrirséð og vextir (um 36%)	42,9	"
<u>Samtals</u>	<u>163,0</u>	<u>Mkr.</u>

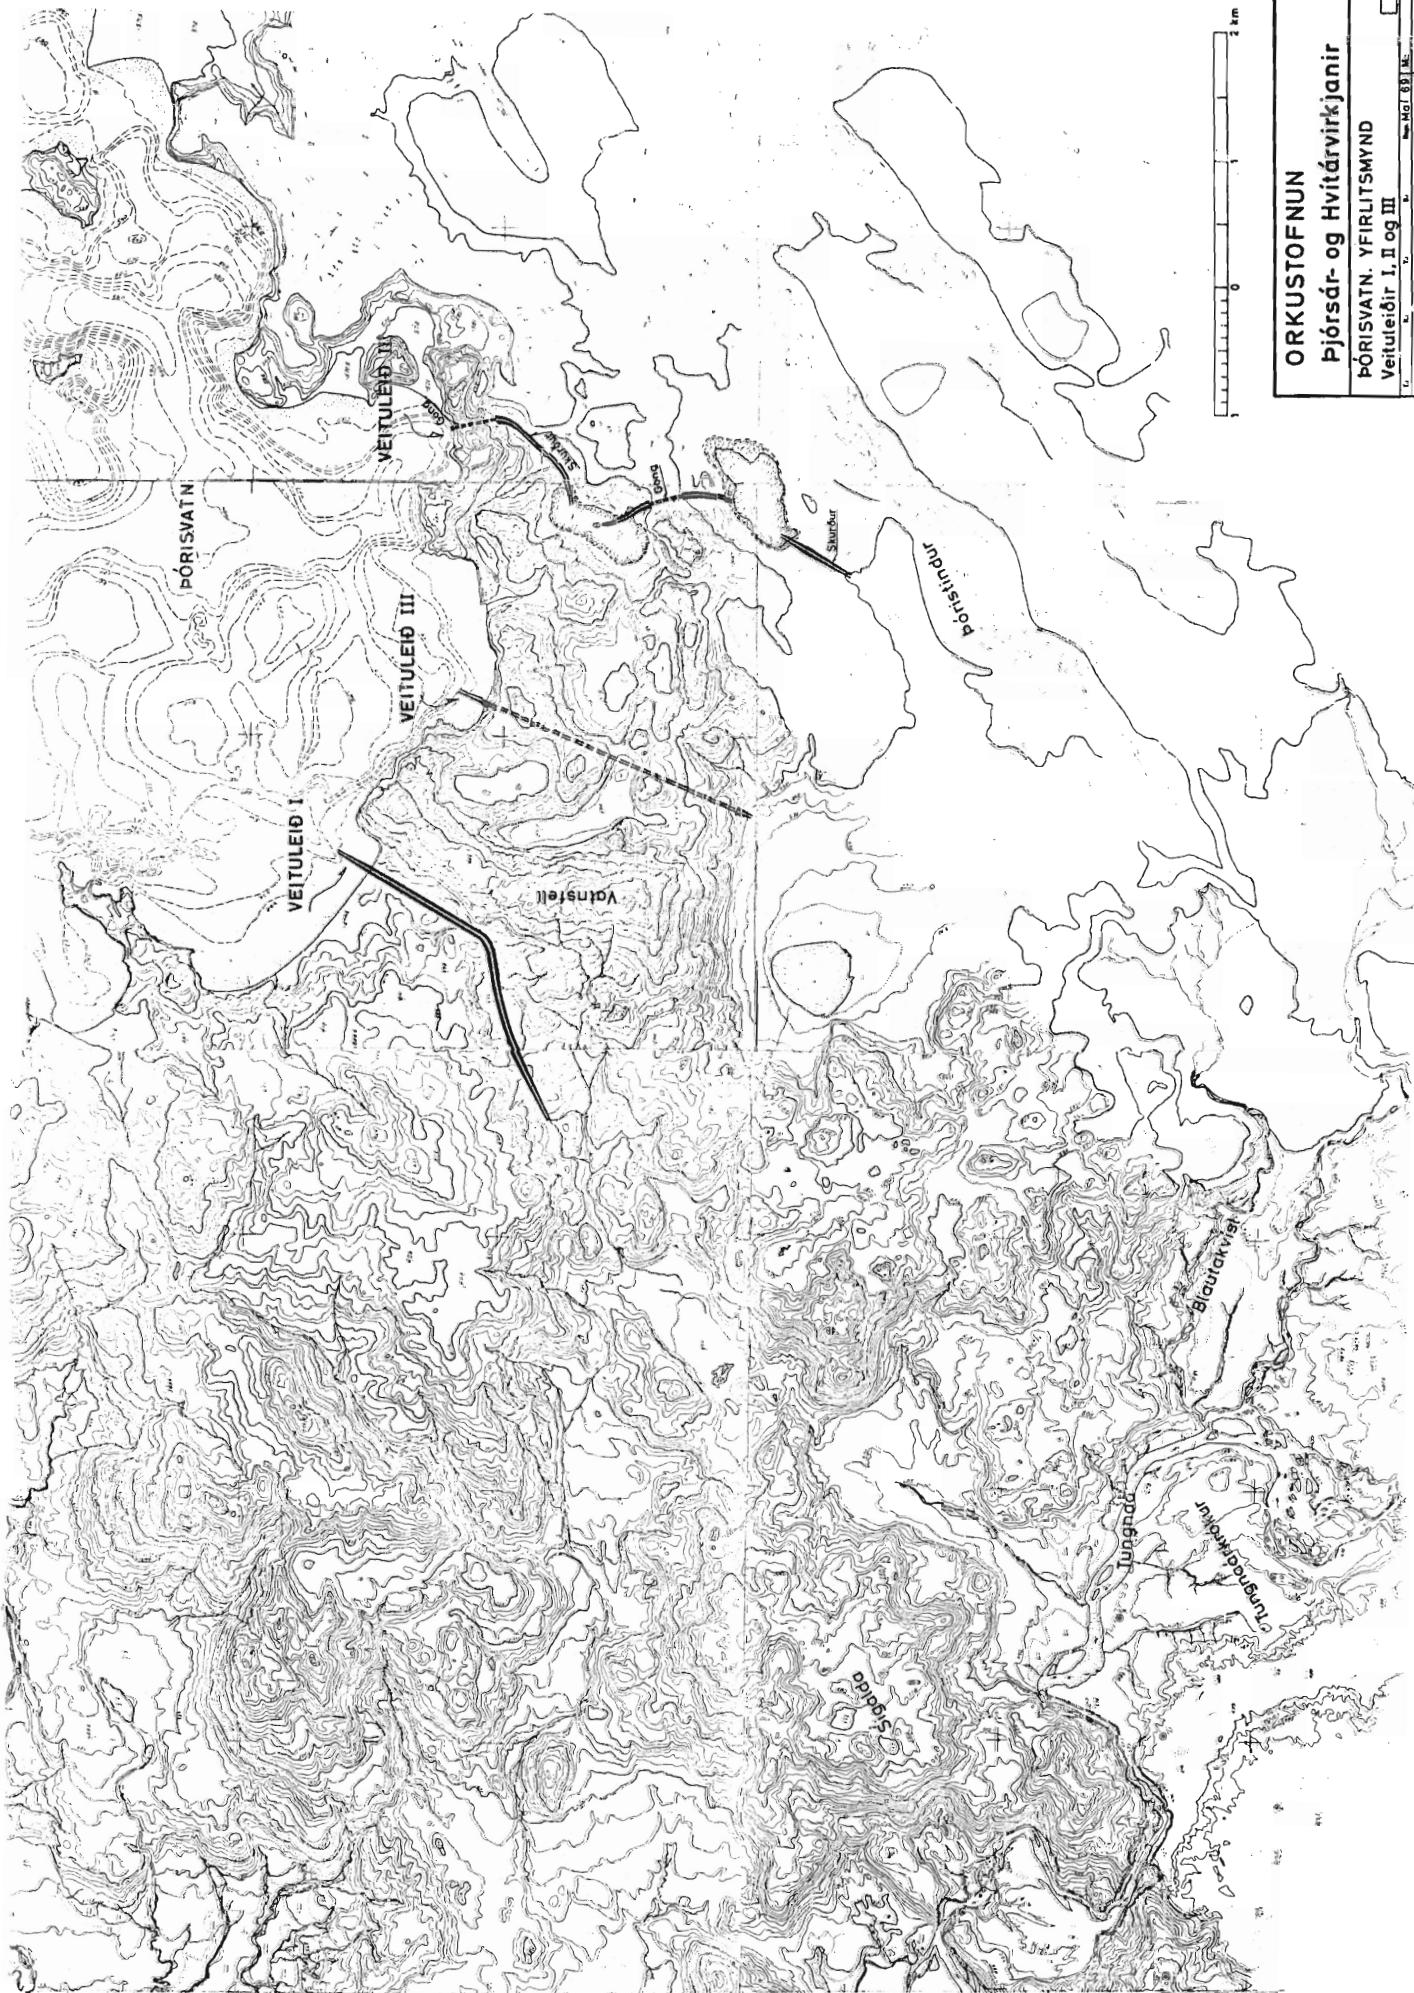

ORKUSTOFNUN
Pjórsár- og Hvitárvirkjanir

PÓRSVATN. YFIRLITSMYND


Veituleiðir I, II og III

SIGURÐUR THORODDSEN. VÉRKJEDISTÓRA S.F.
ANNAÐUR SAM. 8.10.2001
MGL 89 N.E.


01.07.2.01

ORKUSTOFNUN
Pjörsá- og Hvítárvirkjanir
PÓRISVATN. VFLRÍLTSMYND
Velti úr Kóldukvísl og sífla í Pjörsöli


01.07.2.02

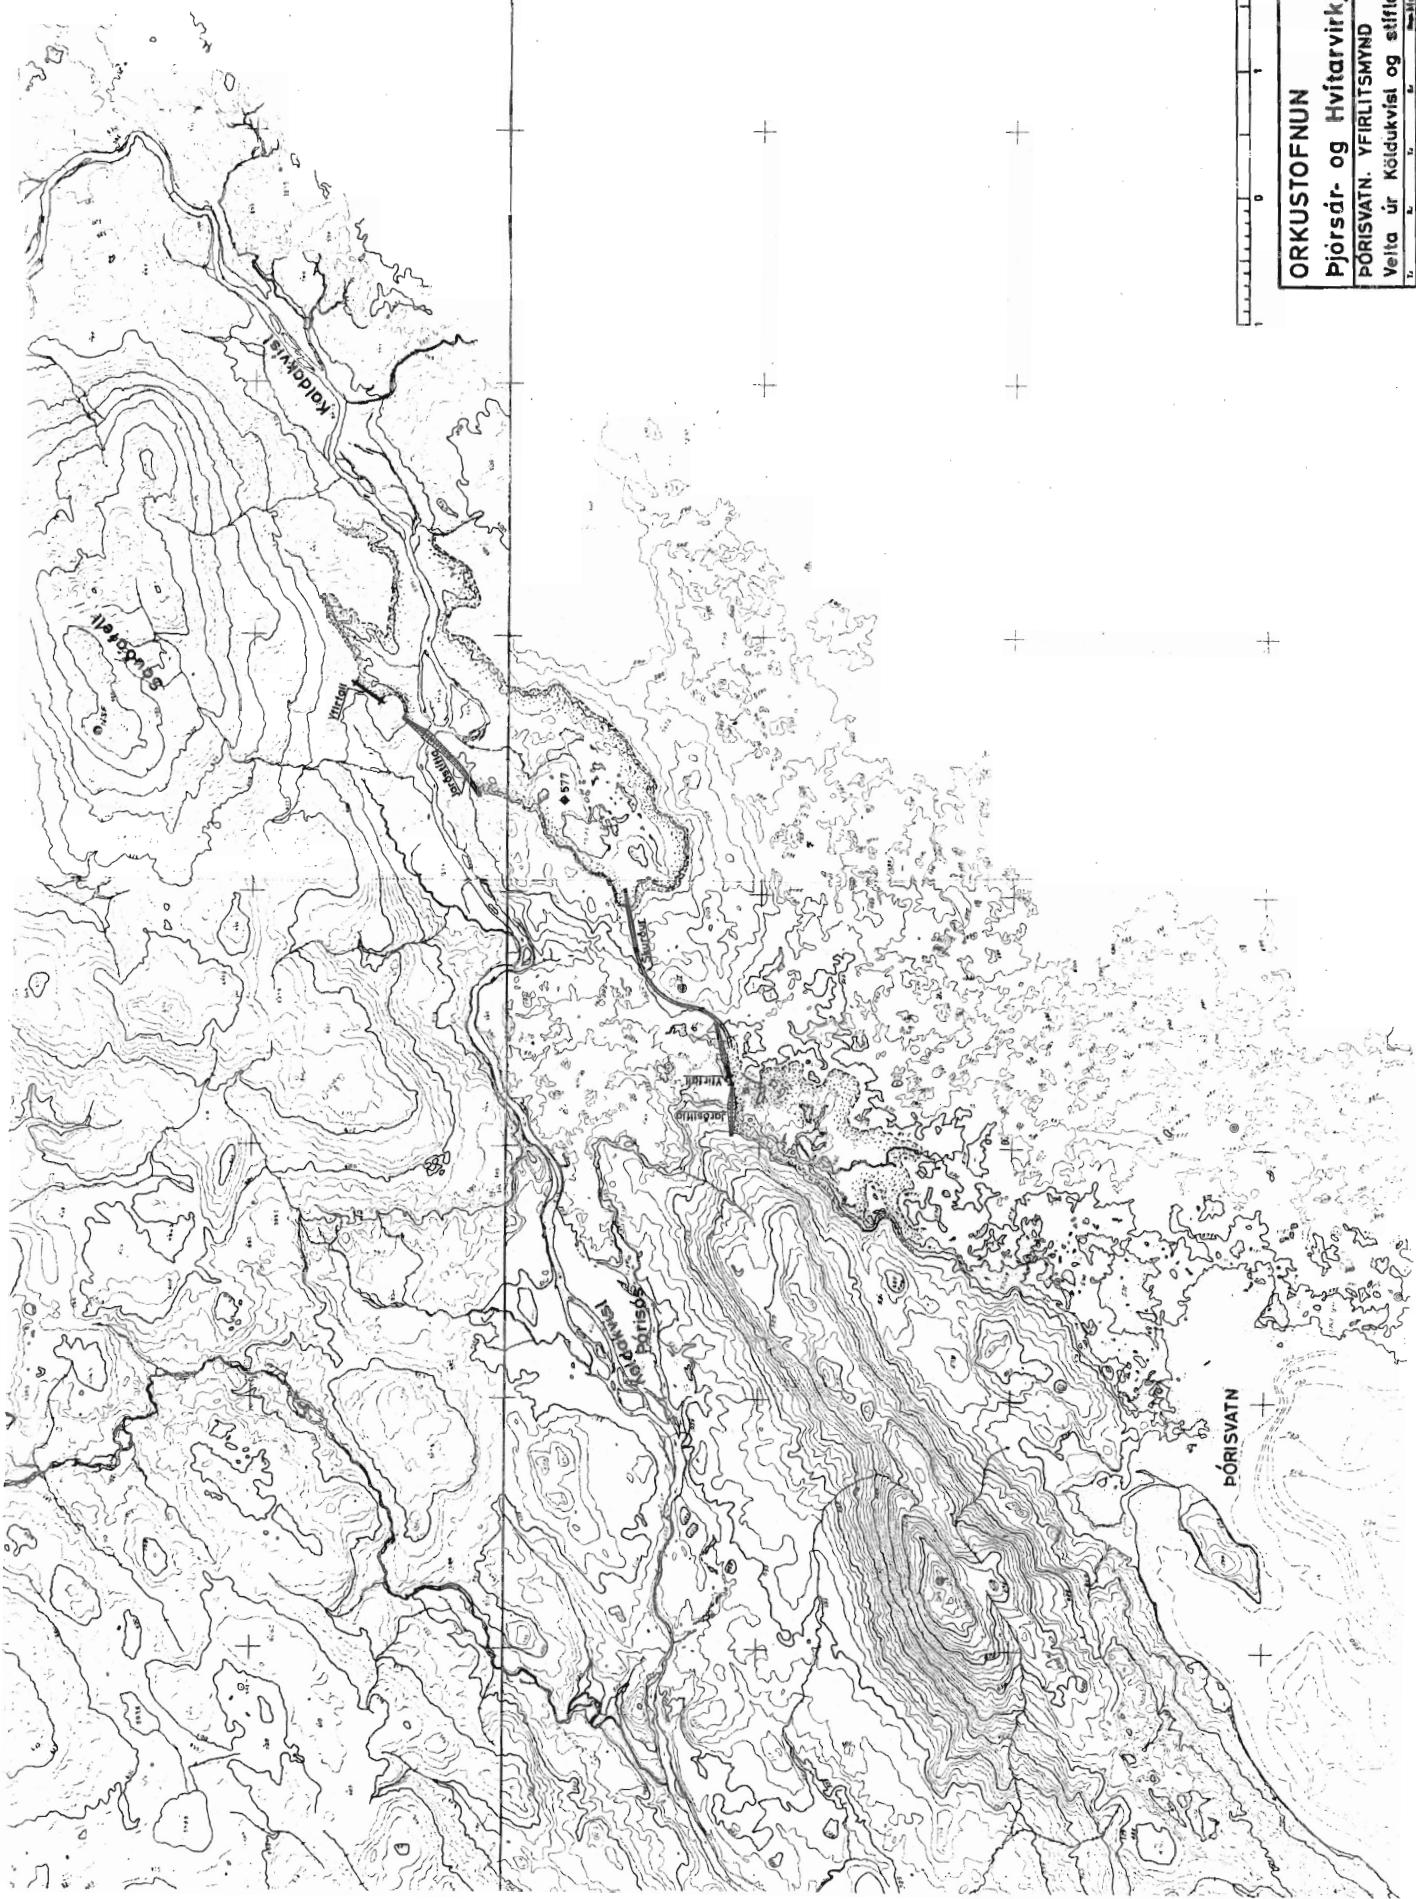


SCALING 1:50,000
D. THORODDSEN - VERKEFNAÐISTOFA S.F.
ANNAKA 8.1978

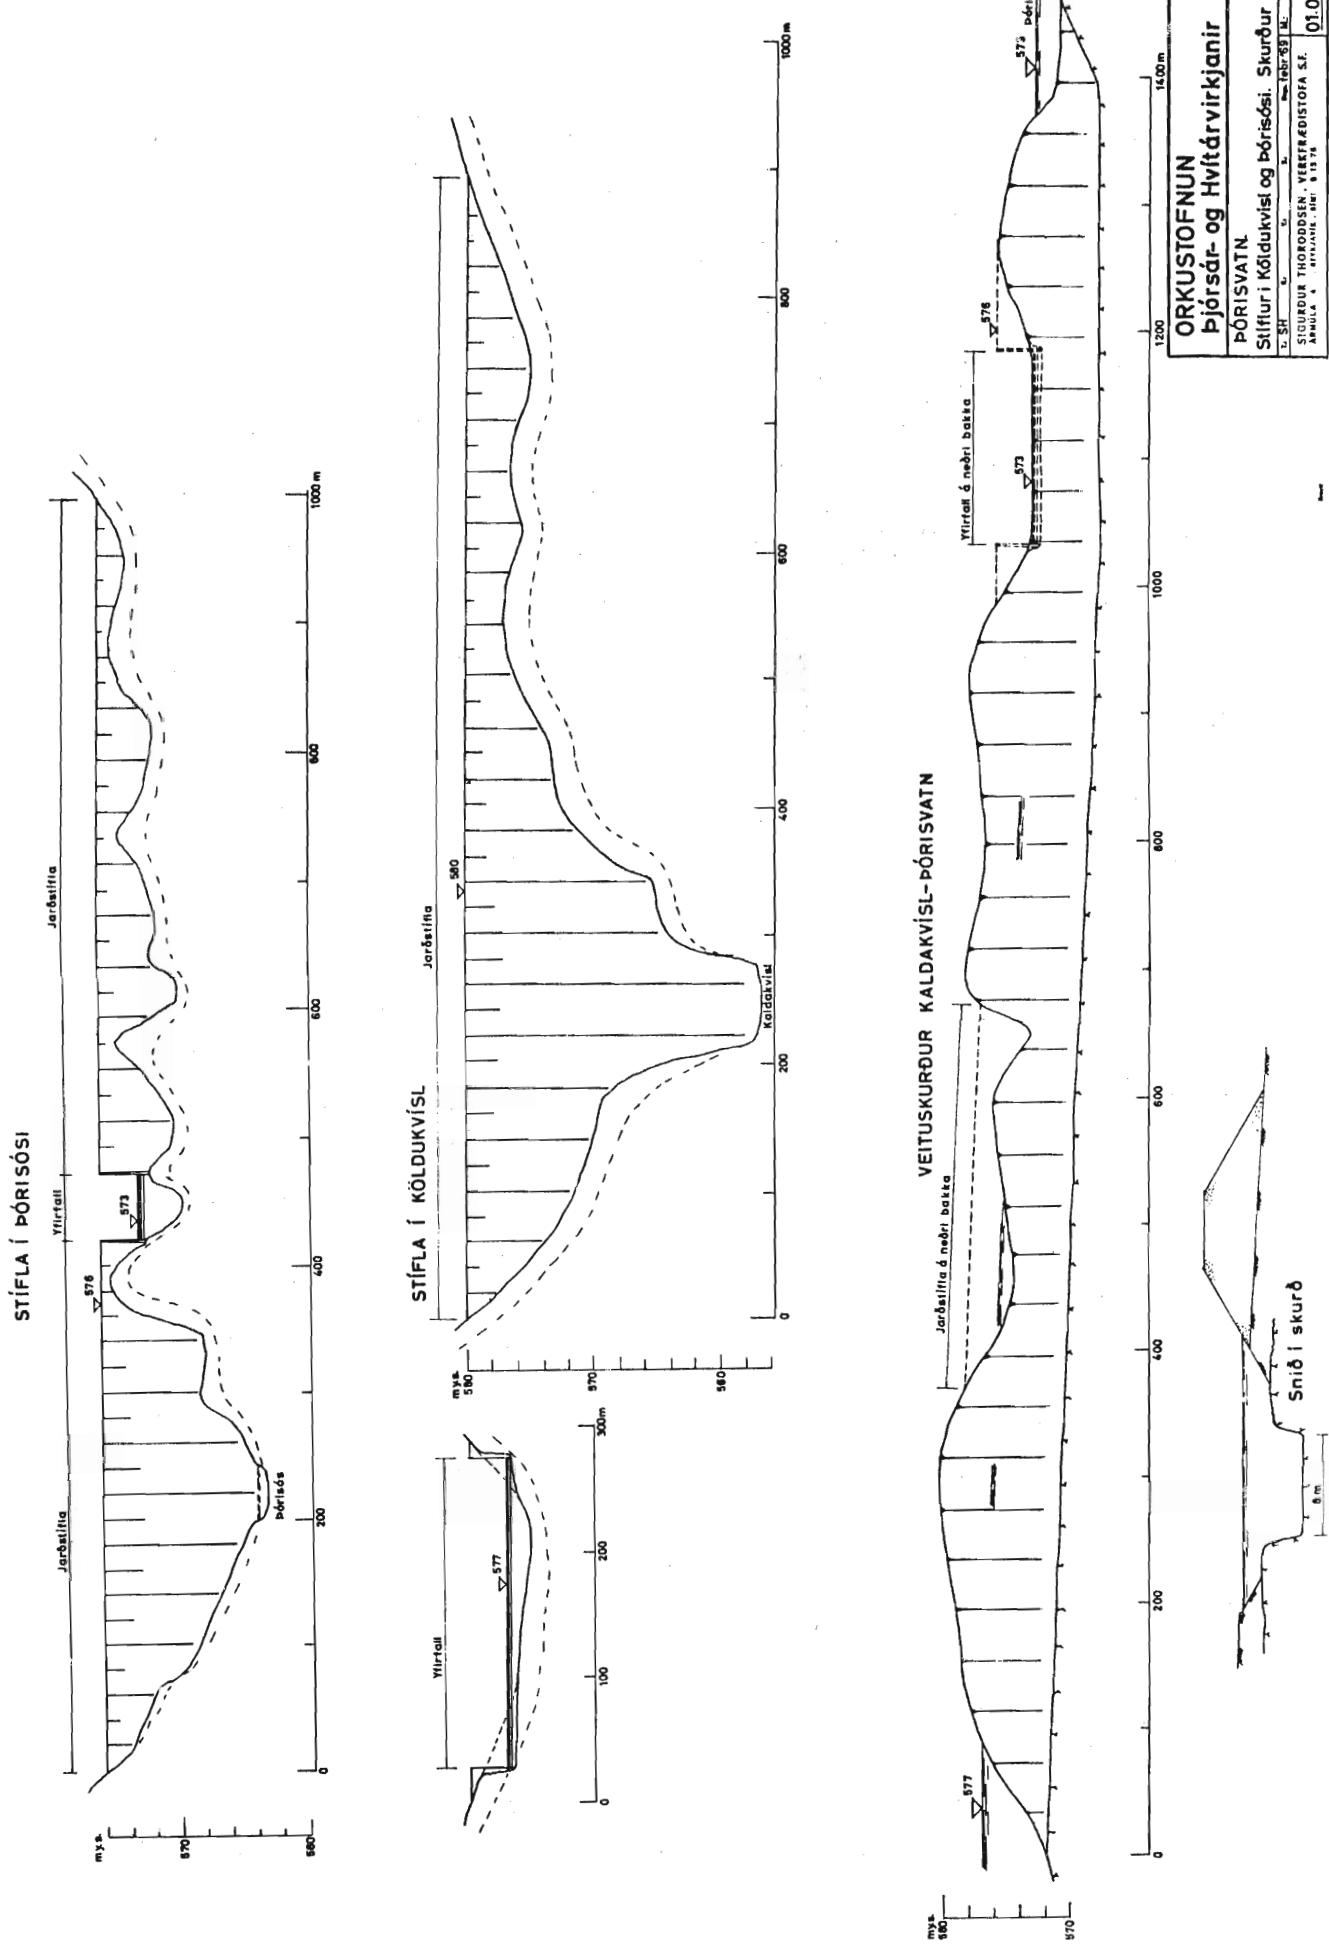


VEITULEÐ I. LANGSNÍÐ



VEITULEÐ II. LANGSNÍÐ

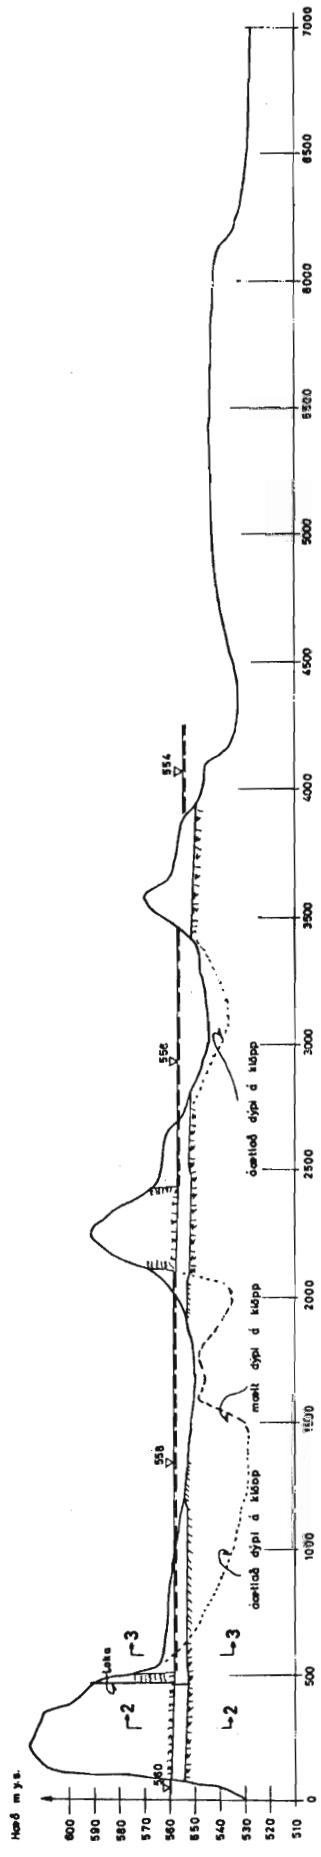

VEITULEÐ III. LANGSNÍÐ

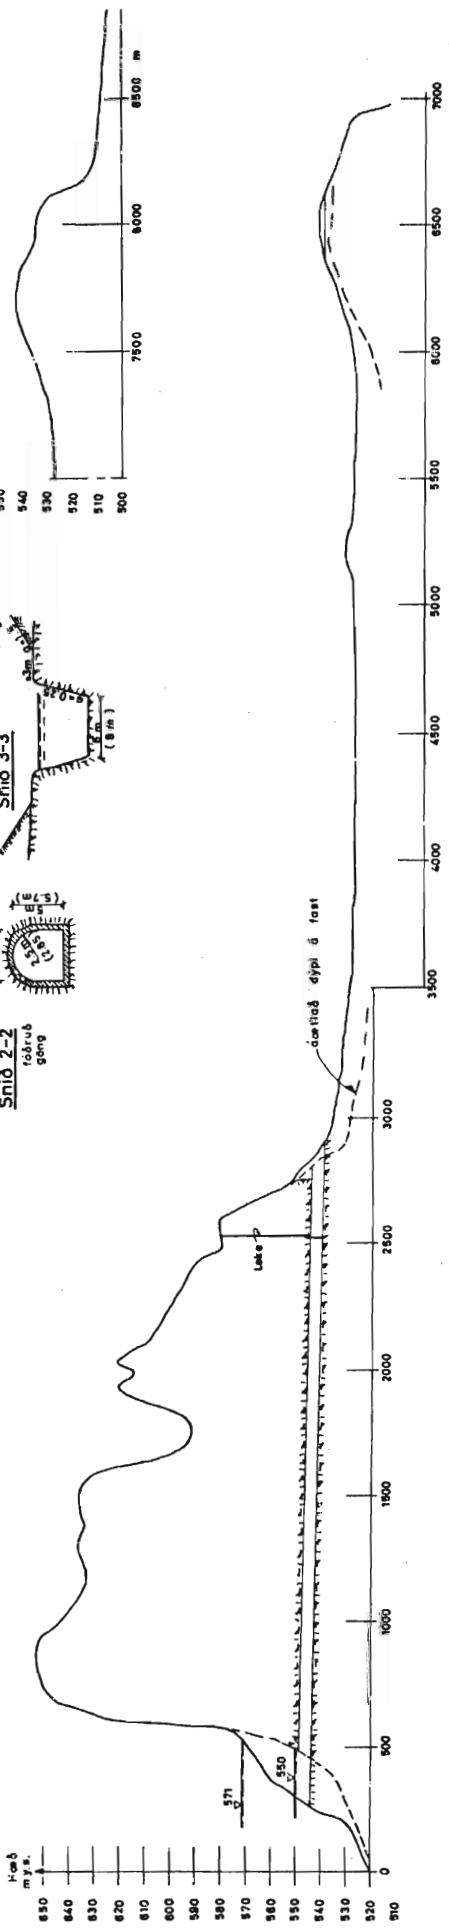

Breyti á uppláttum ORKUSTOFFNAR
í meikvarða 1:10000 með 5 m högðar!
Linnun (biðað 3341, 3440 og 3441),
Myndmað kort Farverk hf. Reykjavík
og A/B Stockholm.

ORKUSTOFFNUN
Þjórsá- og Hvítárvirkjanir

ÞORISVATN

Langnáð i veituleðir I, II og III

SÍGURÐUR ÞORODD ÓEN VEFNAÐISTORA S.F.

Mál 89 kl.

Árbæki 1978. Síða 1 af 104

ORKUSTOFNUN
Hjórsá- og Hvitárvirkjanir
PÖRISVATN
Veita úr Tunngáð í Hörisvatn
SIGURÐUR THORÐÐSSON - VERNIR ÆÐISTOFNA SE.
REYKJAVÍK, 20. MAJ 2005
01.07.2005

